



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Primer Semestre Año 2022

Director General
Marcos Makón

Dirección de Análisis Presupuestario

Analista
Julieta Olivieri

22 de julio de 2022

ISSN 2683-9598

Índice de contenidos

Resumen Ejecutivo	4
Ejecución financiera de la Inversión Pública	5
Ejecución de la Inversión Pública por función.....	6
Ejecución de la Inversión Pública por jurisdicción.....	7
Ejecución de la Inversión Pública por fuente de financiamiento.....	8
Ejecución financiera y física de la Inversión Real Directa	10
Ejecución financiera y física de los proyectos de inversión	10
Ejecución de la adquisición de bienes de capital.....	12
Ejecución financiera de las Transferencias de Capital	13
Anexos	15
Aspectos Metodológicos	21

Índice de cuadros

Cuadro 1. Composición de la Inversión Pública.....	5
Cuadro 2. Inversión pública por función.....	6
Cuadro 3. Inversión pública por jurisdicción.....	8
Cuadro 4. Inversión pública por fuente de financiamiento.....	8
Cuadro 5. Principales organismos receptores del crédito externo.....	9
Cuadro 6. Principales organismos financiadores de inversión pública.....	9
Cuadro 7. Composición de la Inversión Real Directa.....	10
Cuadro 8. Principales 20 obras en proyectos de inversión	11
Cuadro 9. Principales adquisiciones de bienes de capital por Jurisdicción	12
Cuadro 10. Transferencias de capital por destinatario	13
Cuadro 11. Transferencias de capital a Provincias.....	14
Cuadro 12. Proyectos de Inversión por ubicación geográfica.....	15
Cuadro 13. Principales obras en proyectos de inversión por ubicación geográfica.....	16

Índice de gráficos

Gráfico 1. Evolución de la Inversión Pública de la Administración Nacional.....	5
Gráfico 2. Ejecución trimestral de la inversión pública.....	6
Gráfico 3. Composición de la inversión pública por funciones y sus principales conceptos.....	7
Gráfico 4. Inversión pública por jurisdicción.....	7
Gráfico 5. Inversión pública por fuente y organismos financiadores	9
Gráfico 6. Composición de la IRD y variaciones reales.....	10
Gráfico 7. Adquisición de bienes por jurisdicción y principales conceptos.....	12
Gráfico 8. Composición de las transferencias al Sector Público y principales destinatarios.....	13

Resumen Ejecutivo

La Inversión Pública (IP)¹ ejecutada por la Administración Nacional (APN) durante el primer semestre de 2022 ascendió a \$475.813 millones, lo cual representa un crecimiento en términos reales² del 2,0% año contra año (a/a) y una ejecución comparada con el crédito vigente de 33,3%. La variación registrada con relación a la ejecución del primer semestre del 2021 se explica por la Inversión Real Directa (IRD) (\$144.770 millones) que exhibió un crecimiento interanual del 9,4% a/a y logró compensar la caída del 1,0% a/a en las Transferencias de Capital (TC) (\$331.043 millones).

Desde el punto de vista funcional del gasto, cuatro sectores concentraron el 74,0% de la inversión: vivienda y urbanismo, transporte, agua potable y educación y cultura. Mientras que vivienda y educación mantuvieron incrementos reales de un año a otro (40,0% a/a y 7,4% a/a, respectivamente), transporte y agua potable exhibieron caídas con relación a la ejecución de un año atrás (8,3% a/a y 26,2% a/a, respectivamente). Con relación a la inversión por jurisdicción, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat concentraron el 58,7% de las erogaciones de capital.

La Inversión Real Directa (IRD), uno de los dos conceptos que integran la inversión pública, se compone de los proyectos de inversión (\$95.919 millones) y de la adquisición de bienes de capital (\$48.851 millones) cuya ejecución está a cargo en forma directa por la Administración Nacional. La ejecución presupuestaria de proyectos de inversión fue inferior a la del primer semestre del 2021 (-5,8% a/a) y se correspondió con 543 obras relacionadas mayoritariamente con la construcción de autopistas y autovías, mantenimiento de rutas y la construcción de jardines infantiles en diferentes puntos del país. Por su parte, la adquisición de bienes de capital registró una variación real positiva de 58,6% a/a impulsada en gran medida por la compra de computadoras portátiles para la distribución en las escuelas en el marco del Programa Conectar Igualdad, a cargo del Ministerio de Educación.

El segundo componente de la inversión pública lo integran las Transferencias de Capital con un total que alcanza los \$331.043 millones en el primer semestre del año, cuyo objetivo es financiar proyectos y adquisición en equipos en instituciones que no forman parte de la Administración Nacional. Estos fondos representaron una proporción mayor dentro del total devengado en inversión pública (69,6%), pero registraron una caída interanual del 1,0% a/a. Desde el punto de vista de los destinatarios se destacan los fondos fiduciarios y otros entes (\$142.910 millones), con un crecimiento interanual de 48,3% a/a. En segundo y en tercer lugar las provincias y municipios (\$95.935 millones) y las empresas públicas (\$67.512 millones) exhibieron disminuciones reales en comparación con la ejecución de un año atrás del 27,5% a/a y 22,1% a/a, respectivamente, que no pudieron ser compensadas con el crecimiento en transferencias de capital a fondos fiduciarios.

El 88,6% del financiamiento del gasto en inversión correspondió a fuentes internas, principalmente provenientes de recursos del tesoro nacional y del crédito interno y el 11,4% restante a fuentes externas, fundamentalmente del crédito externo. Las fuentes internas exhibieron un crecimiento de 2,0% a/a y un nivel de ejecución equivalente al 34,2% del crédito vigente, mientras que las fuentes externas se incrementaron 1,4% a/a y devengaron el 27,3% del presupuesto asignado.

Por último, es importante destacar la dinámica de la ejecución de la inversión pública que de acuerdo con el comportamiento histórico se acelera en la segunda mitad del año. Al primer semestre se ejecutó el 33,3% del crédito vigente y puede esperarse un mayor ritmo de ejecución en el segundo.

¹ La inversión pública analizada en este informe comprende dos de los tres componentes que integran los gastos de capital: la inversión real directa y las transferencias de capital. No incluye la inversión financiera.

² Para el cálculo de las variaciones reales se utiliza como deflactor la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Nivel General Nacional (INDEC).

Ejecución financiera de la Inversión Pública

La inversión pública (IP) ejecutada durante el primer semestre de 2022 ascendió a \$475.813 millones lo que representó un incremento real del 2,0% a/a con relación a la ejecución del primer semestre del 2021. Esto se explica por el crecimiento de la inversión real directa (9,4% a/a), que logró compensar la disminución de las transferencias de capital (-1,0% a/a). Desde el punto de vista de la comparación de la ejecución con el crédito vigente la inversión pública devengó el 33,3%, con guarismos muy similares en ambos componentes.

Cuadro 1. Composición de la inversión pública


Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Inversión Pública	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Inversión Real Directa	433.293	144.770	33,4	9,4
Transferencias de Capital	997.222	331.043	33,2	-1,0
Total	1.430.515	475.813	33,3	2,0

FUENTE: OPC, en base a datos E.Sidif.

Gráfico 1. Evolución de la Inversión Pública de la Administración Nacional

Primer semestre, 2018 a 2022, en millones de \$ constantes (IS de 2022)

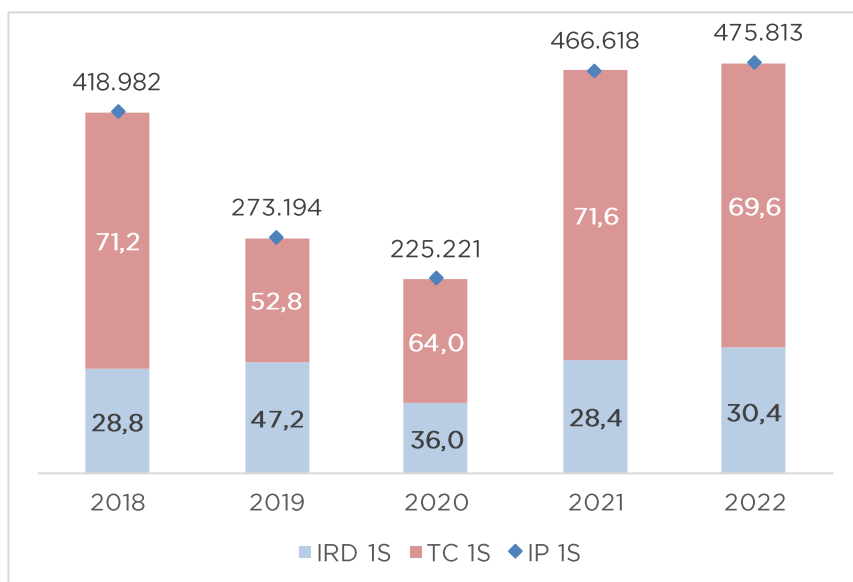


La inversión pública del primer semestre del año en curso se mantiene en niveles muy similares a las del mismo período del 2021. En los primeros semestres del período 2018-2020 la ejecución en inversión resultó decreciente, con un mínimo en el primer semestre del 2020, afectado por la pandemia. En 2021 se logró una recuperación que se incrementó levemente en 2022.

FUENTE: OPC, en base a datos E.Sidif.

Gráfico 2. Ejecución trimestral de la inversión pública

2018 a 2022, en % de representación trimestral sobre la ejecución anual y sobre el crédito vigente en 2022

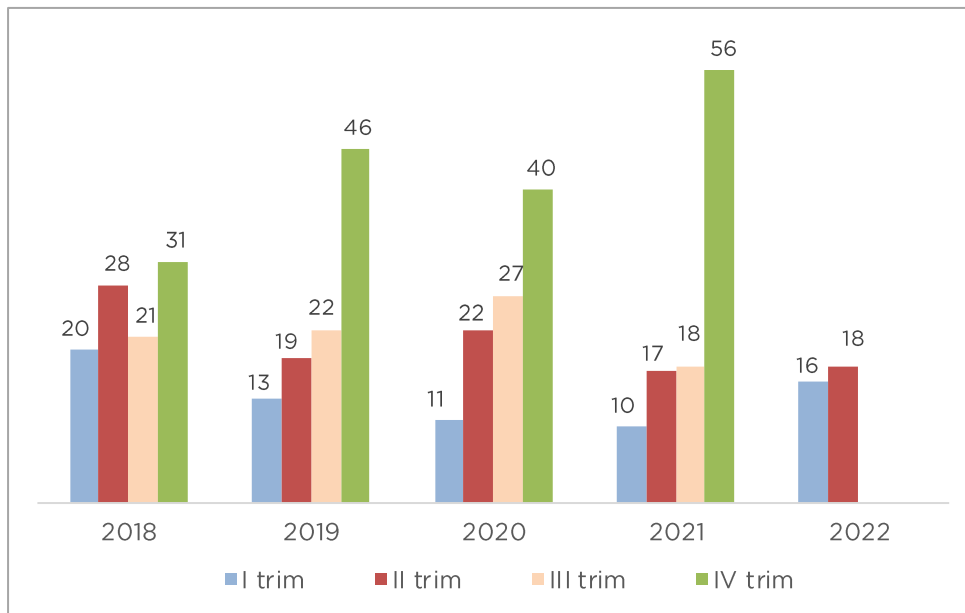

La ejecución de la inversión pública se acelera a medida que transcurre el ejercicio. En 2021 más de la mitad del devengado se registró en el último trimestre del año. Durante el primer semestre de 2022 se ejecutó el 33,3% del crédito vigente, con una tendencia creciente.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución de la Inversión Pública por función

Cuadro 2. Inversión pública por función

Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a


Función	Vigente	Devengado	% de ejec.	Var. % real a/a
Vivienda y Urbanismo	345.135	132.348	38,3	40,0
Transporte	306.414	107.281	35,0	-8,3
Agua Potable	197.641	65.130	33,0	-26,2
Educación y Cultura	165.073	47.285	28,6	7,4
Energía	130.918	32.877	25,1	68,1
Ciencia y Técnica	49.899	22.098	44,3	75,3
Ecología y Medio Ambiente	24.787	12.810	51,7	47,7
Relaciones Interiores	34.200	12.371	36,2	2,9
Resto	176.447	43.613	24,7	-37,6
Total	1.430.515	475.813	33,3	2,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Durante el primer semestre la inversión pública devengada se canalizó mayormente hacia vivienda y urbanismo y transporte, que en conjunto representaron prácticamente la mitad de las erogaciones. La primera función registró un incremento interanual del 40,0%, mientras que la segunda se contrajo 8,3% a/a.

Gráfico 3. Composición de la inversión pública por funciones y sus principales conceptos

Primer semestre, en % sobre el total de la IP

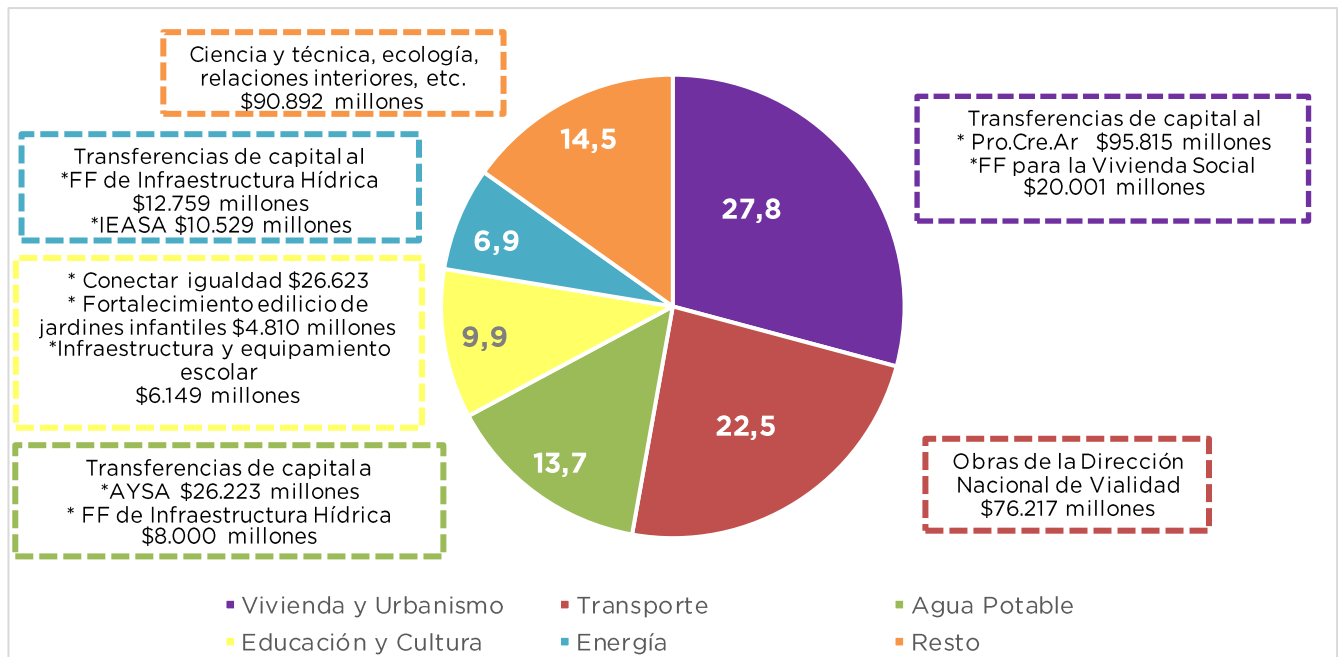


FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución de la Inversión Pública por jurisdicción

El 92,0% del gasto en inversión pública se concentra en 7 jurisdicciones y el 33,0% en el Ministerio de Obras Públicas.

Gráfico 4. Inversión pública por jurisdicción

Primer semestre, 2021 y 2022, en millones de \$ constantes (IS 2022)

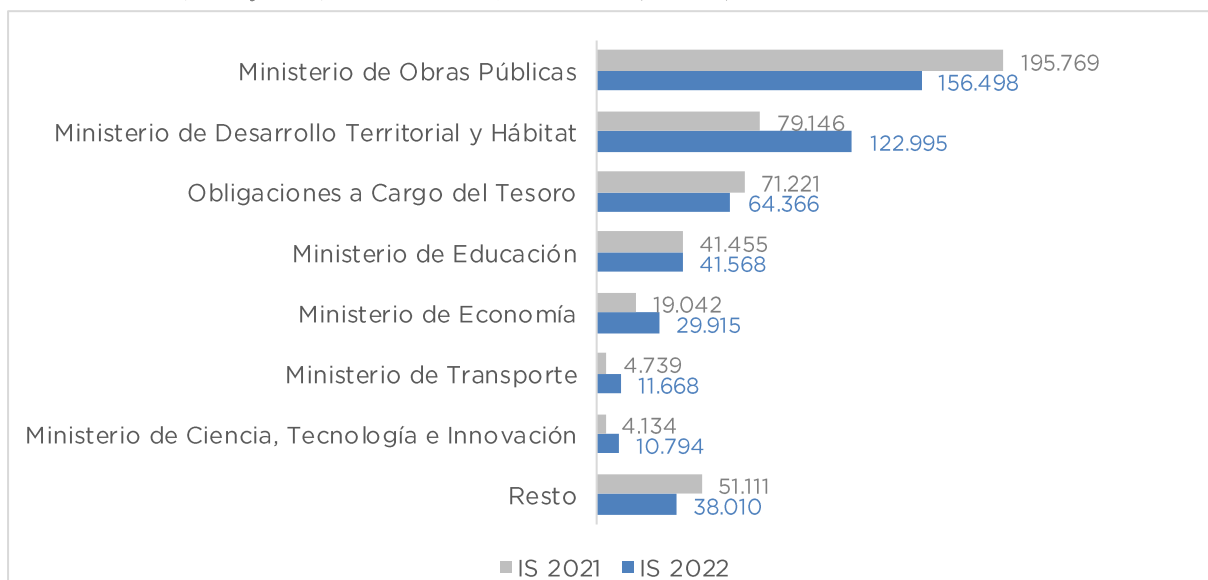

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 3. Inversión pública por jurisdicción

Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Jurisdicción	Vigente	Devengado	% de ejec.	Var. % real a/a
Ministerio de Obras Públicas	387.346	156.498	40,4	-20,1
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	301.045	122.995	40,9	55,4
Obligaciones a Cargo del Tesoro	264.216	64.366	24,4	-9,6
Ministerio de Educación	151.139	41.568	27,5	0,3
Ministerio de Economía	72.924	29.915	41,0	57,1
Ministerio de Transporte	66.380	11.668	17,6	146,2
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	21.873	10.794	49,3	161,1
Ministerio de Defensa	21.863	7.117	32,6	-22,9
Ministerio de Desarrollo Social	14.830	6.166	41,6	36,4
Ministerio de Desarrollo Productivo	38.056	5.683	14,9	-68,2
Ministerio del Interior	11.494	3.871	33,7	-13,6
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	11.392	3.085	27,1	-21,6
Ministerio de Seguridad	8.229	2.005	24,4	48,1
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca	10.947	1.792	16,4	8,4
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.768	1.409	24,4	168,3
Ministerio de Cultura	6.025	1.406	23,3	507,8
Ministerio de Salud	13.497	1.309	9,7	-46,1
Ministerio de Turismo y Deportes	3.822	1.207	31,6	-38,9
Presidencia de la Nación	4.022	794	19,7	-2,7
Poder Judicial de la Nación	3.664	648	17,7	49,4
Poder Legislativo Nacional	1.717	474	27,6	64,5
Jefatura de Gabinete de Ministros	5.920	460	7,8	-21,3
Ministerio Público	1.340	362	27,0	-0,2
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	761	105	13,8	-45,6
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad	1.866	77	4,1	-66,9
Ministerio de Relaciones Exteriores	381	41	10,7	139,0
Total	1.430.515	475.813	33,3	2,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución de la Inversión Pública por fuente de financiamiento

Cuadro 4. Inversión pública por fuente de financiamiento

Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Fuentes de Financiamiento	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var% real a/a
Fuentes Internas	1.230.973	421.336	34,2	2,0
Tesoro Nacional	644.709	251.080	38,9	-15,3
Recursos Propios	13.516	2.874	21,3	17,7
Recursos con Afectación Específica	38.809	6.742	17,4	-40,1
Transferencias Internas	26.449	1.139	4,3	-90,7
Crédito Interno	507.490	159.501	31,4	76,4
Fuentes Externas	199.542	54.477	27,3	1,4
Transferencias Externas	560	204	36,5	91,3
Crédito Externo	198.982	54.273	27,3	1,2
Total	1.430.515	475.813	33,3	2,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 5. Principales organismos receptores del crédito externo

Primer semestre, en millones de \$ y en % de ejecución

Organismos receptores	Vigente	Devengado	% de ejecución
Ministerio de Obras Públicas	35.781	21.250	59,4
Ministerio de Transporte	43.545	9.913	22,8
Ministerio de Educación	17.414	6.419	36,9
Dirección Nacional de Vialidad	13.451	3.919	29,1
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat	12.233	2.094	17,1
Ministerio de Desarrollo Social	3.471	1.672	48,2
Secretaría de Energía	17.975	1.505	8,4
Resto	55.111	7.501	13,6
Total	198.982	54.273	27,3

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 6. Principales organismos financiadores de inversión pública


Primer semestre, en millones de \$ y en % de ejecución

Organismo Financiador	Vigente	Devengado	% de ejecución
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	82.101	24.505	29,8
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)	40.396	14.340	35,5
Corporación Andina de Fomento (CAF)	23.931	6.951	29,0
China Development Bank (CDB)	39.678	6.196	15,6
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata	6.419	1.861	29,0
Banco Centroamericano de Integración Económica	1.519	200	13,1
Resto	4.938	220	4,5
Total	198.982	54.273	27,3

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Gráfico 5. Inversión pública por fuente y organismos financiadores

Primer semestre, en % de representación

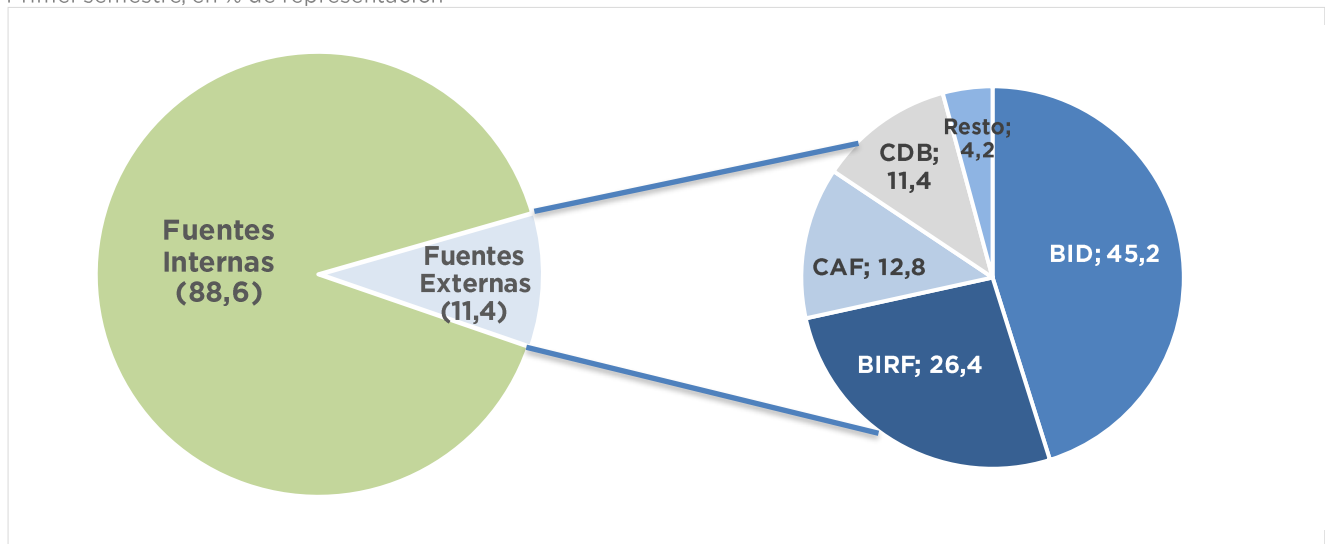

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución financiera y física de la Inversión Real Directa

La ejecución del gasto en IRD de la Administración Nacional en el primer semestre del año totalizó \$144.770 millones, de los cuales \$95.919 millones (66,3%) correspondieron a Proyectos de Inversión y \$48.851 millones (33,7%) a adquisiciones de bienes de capital. Con respecto a la ejecución del primer semestre del 2021 se registró un crecimiento real de 9,4% a/a impulsado por la adquisición de bienes de capital.

Cuadro 7. Composición de la Inversión Real Directa


Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Concepto	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Proyectos de inversión	259.109	95.919	37,0	-5,6
Adquisiciones de Bs. de capital	174.184	48.851	28,0	58,6
Total	433.293	144.770	33,4	9,4

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Gráfico 6. Composición de la IRD y variaciones reales

Primer semestre, en % de participación y % de var. real a/a

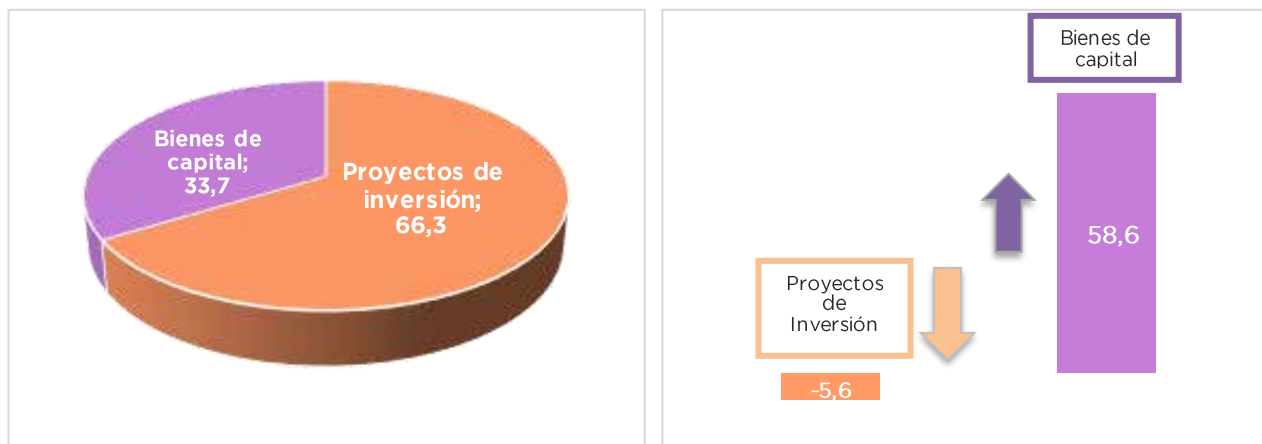

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución financiera y física de los proyectos de inversión

La ejecución en proyectos de inversión durante el primer semestre del 2022 correspondió a 543 obras por un total de \$95.919 millones.

Desde un análisis físico-financiero se observa que 20 obras de las 543 concentran casi la mitad de la ejecución en proyectos (48,9%), correspondiendo 14 a la Dirección Nacional de Vialidad. El resto de la ejecución financiera (51,1%) se distribuye entre los restantes 523 proyectos.

Se expone a continuación el nivel de ejecución financiera y física del primer semestre de 2022 para las 20 principales obras.

Cuadro 8. Principales 20 obras en proyectos de inversión

Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % avance físico

Obras	Ubicación geográfica	Ejecución financiera al 30/6 (millones de \$)			Ejecución física al 30/6 (% de avance)		
		Vigente	Dev.	% de ejec.	Prog. anual	Ejec.	% de ejec.
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	Varias	21.586	5.924	27,4	16,48	8,00	48,5
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	Ciudad de Buenos Aires	11.703	5.329	45,5	1,60	0,82	51,3
Construcción de Reactor RA-10	Buenos Aires	6.697	3.764	56,2	3,0	3,15	105,0
Autopista Presidente Juan Domingo Perón	Buenos Aires	5.710	3.595	63,0	15,98	3,78	23,7
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	Varias	12.434	3.524	28,3	100,00	50,00	50,0
Autopista Ruta Nacional N° 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	Santa Fe	3.677	2.783	75,7	17,94	6,09	33,9
Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	Buenos Aires	4.724	2.291	48,5	10,13	6,01	59,3
Ruta Nacional N° 18, Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75) - Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)	Entre Ríos	2.716	2.122	78,1	21,38	11,47	53,6
Autopista Ruta Nacional N° 7 Luján - Junín - Duplicación de Calzada	Buenos Aires	2.802	1.990	71,0	24,98	3,73	14,9
Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	Chubut	2.175	1.670	76,8	34,39	37,66	109,5
Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2	Córdoba	1.854	1.636	88,3	53,4	16,00	30,0
Corredor Ruta Nacional N° 18 Paraná - Concordia	Entre Ríos	2.184	1.559	71,4	9,8	4,20	42,9
Ejecución de Obras de Pavimentación Interjurisdiccionales	Buenos Aires	2.352	1.525	64,9	32,57	32,57	100,0
Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.N° 11 Travesía Urbana Resistencia	Chaco	1.995	1.501	75,2	25,53	14,48	56,7
Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II	La Rioja	1.805	1.383	76,7	17,79	8,48	47,7
Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja	La Rioja	1.766	1.373	77,8	15,1	14,05	93,0
Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40	Río Negro	1.569	1.369	87,3	7,89	5,09	64,5
Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	Interprovincial	2.492	1.309	52,5	16,40	10,72	65,4
Accesos a Bahía Blanca: Bahía Blanca - Tornquist	Buenos Aires	2.438	1.126	46,2	17,60	7,72	43,9
Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur	Ciudad de Buenos Aires	3.668	1.122	30,6	46,62	17,2	36,9
Total		96.344	46.894	48,7	n/c	n/c	n/c

(n/c): no corresponde.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución de la adquisición de bienes de capital

Cuadro 9. Principales adquisiciones de bienes de capital por Jurisdicción


Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Jurisdicción	Vigente	Devengado	% de ejec.	Var. % real a/a
Ministerio de Educación	71.092	27.939	39,3	362,4
Ministerio de Defensa	21.087	7.052	33,4	-22,0
Ministerio de Obras Públicas	11.939	3.781	31,7	-38,0
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social	5.107	1.303	25,5	187,9
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	2.090	1.085	51,9	79,5
Ministerio de Seguridad	6.665	1.080	16,2	-10,5
Ministerio del Interior	3.788	1.068	28,2	345,5
Ministerio de Cultura	4.357	1.040	23,9	1186,7
Resto	48.059	4.503	9,4	-35,9
Total	174.184	48.851	28,0	58,6

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Gráfico 7. Adquisición de bienes por jurisdicción y principales conceptos

Primer semestre, en % de representación

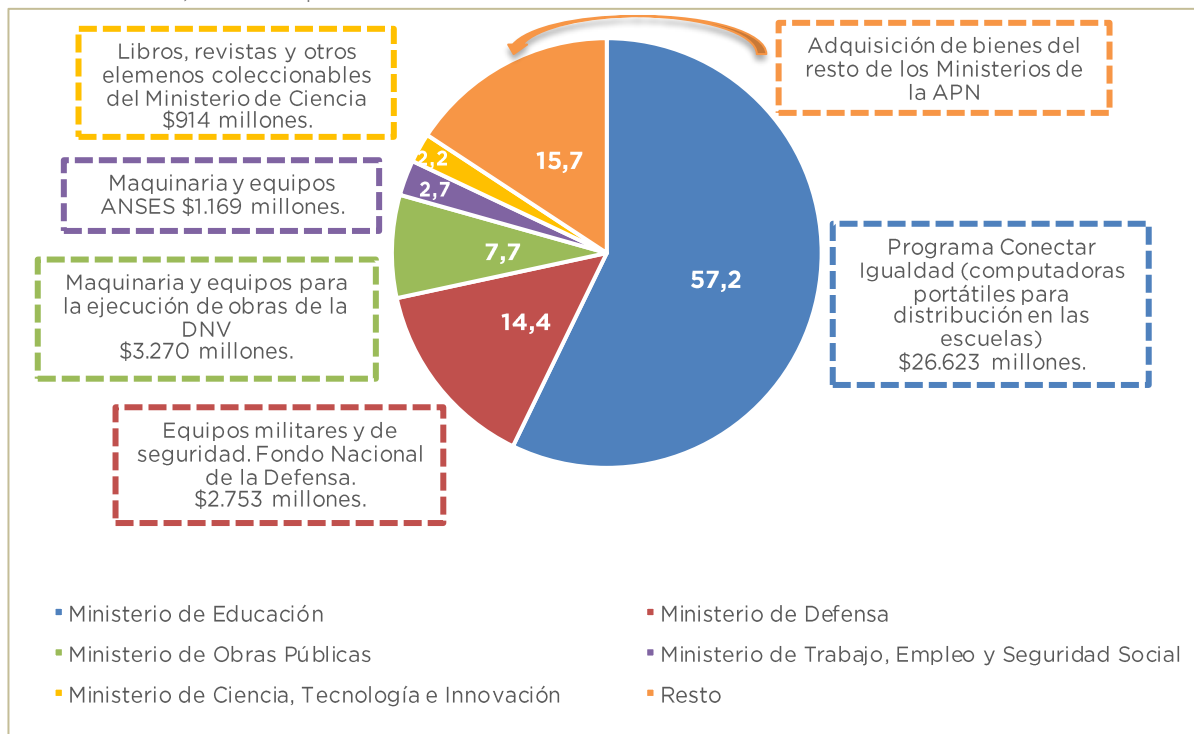

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución financiera de las Transferencias de Capital

Las Transferencias de Capital, el rubro mayor cuantitativamente en términos presupuestarios financieros dentro de la inversión pública, registró una caída del 1,0% en comparación con la ejecución del primer semestre del 2021. La disminución estuvo impulsada en mayor medida por las caídas en las transferencias a empresas públicas (22,1% a/a) y a provincias y municipios (27,5% a/a), que superaron el crecimiento de las transferencias de capital destinadas a fondos fiduciarios y otros entes (48,3%).

Cuadro 10. Transferencias de capital por destinatario


Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var. real a/a

Destinatarios	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Sector Público	953.841	311.425	32,6	-2,1
Fondos Fiduciarios y Otros Entes	324.457	142.910	44,0	48,3
Empresas Públicas	282.081	67.512	23,9	-22,1
Provincias y Municipios	334.848	95.935	28,7	-27,5
Universidades Nacionales	9.080	4.964	54,7	288,0
Resto	3.376	104	3,1	-92,5
Sector Privado	37.653	14.956	39,7	104,8
Empresas Privadas	14.525	3.657	25,2	-1,3
Instituciones Culturales y Sociales	22.985	11.229	48,9	217,9
Resto	143	70	49,0	3,8
Sector Externo	5.728	4.663	81,4	-47,6
Total	997.222	331.043	33,2	-1,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Gráfico 8. Composición de las transferencias al Sector Público y principales destinatarios

Primer semestre, 2021 y 2022, en % sobre el total y en millones de \$ constantes (IS 2022)

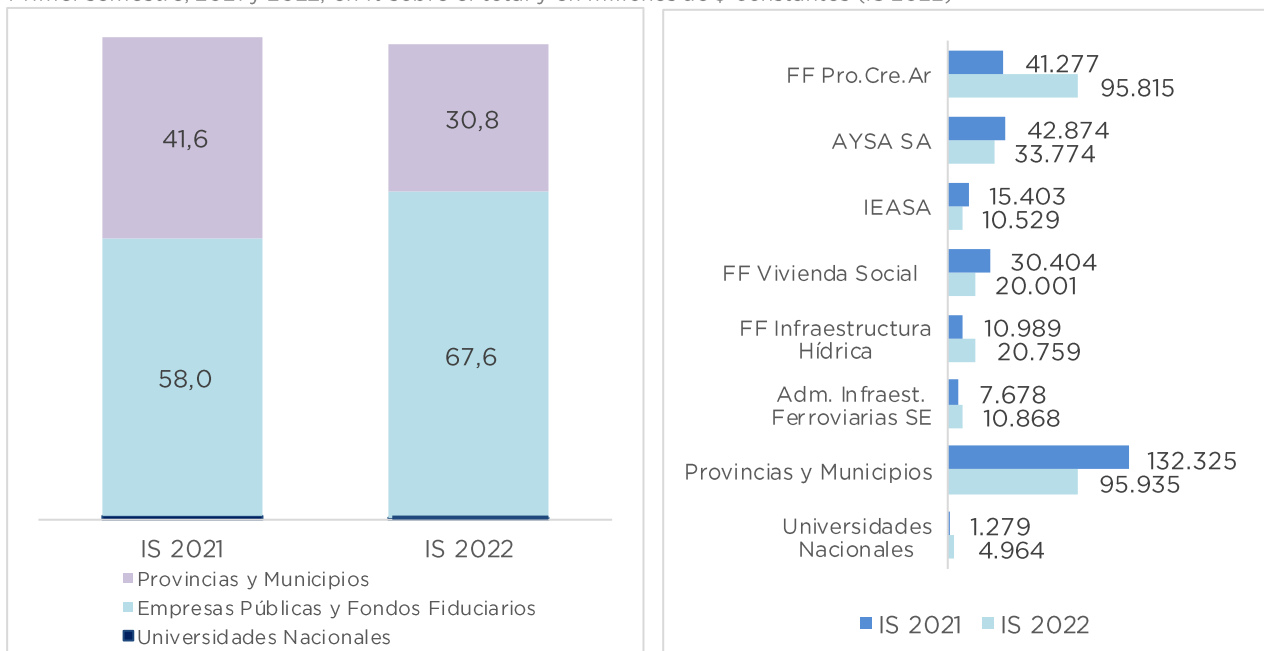

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 11. Transferencias de capital a Provincias

Primer semestre, 2021 y 2022, en millones de \$ y en % de var. real

Provincia	2020	2021	Var. % real a/a
Buenos Aires	23.171	19.726	-45,8
La Rioja	7.761	13.928	14,2
Chaco	5.947	6.878	-26,4
Formosa	3.321	5.010	-4,0
Tucumán	1.852	4.868	67,3
Entre Ríos	4.152	4.751	-27,2
Santiago del Estero	1.974	4.719	52,2
Córdoba	8.480	4.407	-66,9
Santa Fe	2.973	3.706	-20,6
Misiones	1.941	3.175	4,1
Neuquén	2.123	2.908	-12,8
San Juan	1.998	2.789	-11,2
Corrientes	1.956	2.766	-10,0
San Luis	2.329	2.708	-26,0
Catamarca	1.111	2.287	31,1
Tierra del Fuego	639	2.071	106,4
Salta	3.228	2.038	-59,8
Mendoza	2.612	2.015	-50,9
Río Negro	1.417	1.415	-36,4
Jujuy	1.479	1.092	-53,0
Santa Cruz	594	952	2,1
Chubut	1.397	698	-68,2
La Pampa	714	658	-41,3
CABA	1.061	358	-78,5
Total	84.229	95.935	-27,5

La mayoría de las provincias exhibieron caídas reales con relación a la ejecución del primer semestre de 2021. CABA (-78,5% a/a), Chubut (-68,2% a/a) y Córdoba (-66,9% a/a) fueron las que mayores disminuciones registraron, mientras que Tierra del Fuego (106,4% a/a), Tucumán (67,3% a/a) y Santiago del Estero (52,2% a/a) exhibieron incrementos con relación a la ejecución de un año atrás.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Anexos

Cuadro 12. Proyectos de Inversión por ubicación geográfica

Primer semestre, en millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Ubicación geográfica	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Buenos Aires	91.637	24.705	27,0	-21,3
CABA	10.154	8.315	81,9	7,3
Córdoba	13.240	7.146	54,0	-11,4
Santa Fe	12.283	6.191	50,4	-20,4
Entre Ríos	9.327	5.612	60,2	-8,4
Salta	11.502	5.527	48,1	224,0
La Rioja	7.068	4.471	63,3	16,3
Mendoza	7.839	3.177	40,5	10,3
Chubut	5.430	3.119	57,4	36,5
Formosa	5.851	2.970	50,8	66,4
Chaco	4.624	2.873	62,1	12,5
Corrientes	3.278	2.430	74,1	58,7
Río Negro	5.311	2.106	39,7	-50,9
Neuquén	4.205	2.040	48,5	-34,0
Misiones	3.174	1.771	55,8	-9,2
Tucumán	6.007	1.569	26,1	36,8
La Pampa	2.648	990	37,4	-27,3
Santiago del Estero	2.267	933	41,2	14,4
San Juan	2.056	805	39,2	-28,3
Catamarca	2.936	722	24,6	-24,1
Jujuy	2.237	586	26,2	-22,4
San Luis	992	473	47,7	-28,0
Santa Cruz	4.480	350	7,8	-3,9
Tierra del Fuego	10.707	212	2,0	-75,1
Sin región especificada (*)	29.856	6.827	22,9	5,0
Total	259.109	95.919	37,0	-5,6

(*) Incluye proyectos de inversión con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No clasificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 13. Principales obras en proyectos de inversión por ubicación geográfica

Primer semestre, en millones de \$ y % de ejecución

Ubicación geográfica	Vigente	Devengado	% de ejecución
Buenos Aires	91.637	24.705	27,0
Construcción de Reactor RA-10	6.634	3.760	56,7
Autopista Presidente Juan Domingo Perón	5.710	3.595	63,0
Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino (Construcción de 2° Calzada)	4.724	2.291	48,5
Resto	74.570	15.059	20,2
Córdoba	13.240	7.146	54,0
Construcción de Autopista en Variante Ruta Nacional N° 158, Tramo: Ruta Nacional N° 9 - Ruta Provincial N° 2	1.854	1.636	88,3
Autopista Ruta Nacional N° 8 Río Cuarto - Holmberg	1.098	969	88,2
Malla 236 - Rutas R.N.I V09, Tramo: Bell Ville - Pilar - Provincia de Córdoba	686	686	100,0
Resto	9.602	3.855	40,1
Santa Fe	12.283	6.191	50,4
Autopista Ruta Nacional N° 34 Rosario - Sunchales (Construcción de 2° Calzada)	3.323	2.783	83,7
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	-	609	-
Malla 235 - Ruta Nacional N° 1V09 - Provincia de Santa Fe	749	526	70,2
Resto	8.211	2.273	27,7
Entre Ríos	9.327	5.612	60,2
Ruta Nacional N° 18. Tramo II: Colectoras Pavimentadas (Km.67,75)-Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)	2.716	2.122	78,1
Corredor Ruta Nacional N° 18 Paraná - Concordia	2.184	1.559	71,4
Ruta Nacional N° 18. Tramo III: Intersección Ruta Provincial N° 20 (Km.135,60)- Arroyo Sandoval (Km.166)	1.053	776	73,7
Resto	3.373	1.154	34,2
Ciudad de Buenos Aires	10.154	8.315	81,9
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	-	5.329	-
Elevación de Viaducto, Prolongación de Tendido Ferroviario y Construcción Nueva Estación Terminal Constitución - Belgrano Sur	3.668	1.122	30,6
Misiones SABIAMAR (CAF N° 8700)	244,89	240,46	98,2
Resto	6.241	1.624	26,0
Salta	11.502	5.527	48,1
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	5.840	4.649	79,6
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	152	102	67,2
Remodelación del Complejo Fronterizo La Quiaca - Villazón (FONPLATA 28/16)	-	78	-

Resto	5.511	699	12,7
La Rioja	7.068	4.471	63,3
Ruta Nacional N° 73 Anguinán - Empalme Ruta Nacional N° 75 Sección II	1.805	1.383	76,7
Ruta Nacional N° 76 - Tramo Quebrada Santo Domingo Pircas Negras - La Rioja	1.766	1.373	77,8
Ruta Nacional N° 73, Tramo: Los Cajones Anguinán; Sección: Km. 0,00 (Pampa de la Viuda) Km. 21,60	1.367	962	70,4
Resto	2.131	753	35,3
Río Negro	5.311	2.106	39,7
Pavimentación Ruta Nacional N° 23 - Los Menucos - Empalme Ruta Nacional N° 40	1.569	1.369	87,3
Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Cipolletti	1.076	347	32,2
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	126	130	102,8
Resto	2.541	261	10,3
Mendoza	7.839	3.177	40,5
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Luján de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	3.215	1.010	31,4
Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan: Tramo Mendoza - Jocolí	956	956	100,0
Ampliación Establecimiento Depurador El Paramillo, Mendoza (BID N° 3451 OC-AR)	1.443	716	49,6
Resto	2.225	494	22,2
Chaco	4.624	2.873	62,1
Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.N° 11 Travesía Urbana Resistencia	1.995	1.501	75,2
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	-	437	-
Construcción de Nuevo Edificio para la Centralización de la Justicia Federal, Etapa 2. - CF y JF N° 1 Resistencia - Hipólito Yrigoyen	494	185	37,4
Resto	2.135	750	35,1
Formosa	5.851	2.970	50,8
Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.N° 11; Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacional	1.312	953	72,6
Corredor Ruta Nacional N° 11 Resistencia - Formosa: Autovía R.N.N° 11 Tramo: Límite c/Chaco (Km.1.103,16) - Empalme Ruta Nacional	639	510	79,9
Malla 544 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0011/ Ruta Nacional N° A011 - Provincia de Formosa	1.155	412	35,7
Resto	2.746	1.095	39,9
Chubut	5.430	3.119	57,4
Autopista Ruta Nacional N° 3 Puerto Madryn - Trelew	2.175	1.670	76,8
Ruta Nacional N° 25; Tramo: Las Plumas - Paso de Indios; Sección: Km. 234,12 - Km. 313,52	376	375	99,9
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	181	331	182,8

Resto			
Neuquén	4.205	2.040	48,5
Acceso Norte a Neuquén	550	482	87,6
Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura	907	410	45,2
Autopista Ruta Nacional N° 22 Neuquén - Plaza Huinca	768	257	33,5
Resto	1.980	891	45,0
Corrientes	3.278	2.430	74,1
Malla 532 - Ruta Nacional N° 0119 - Tramo: Empalme Ruta Nacional N°14 - Empalme Ruta Nacional N°123 - Provincia de Corrientes	870	695	79,9
Malla 535 - Ruta Nacional N° 0012, Tramo: Empalme R.P.N° 25 - Intersección R.N.N° 123 y Ruta R.N.N° 0123	750	685	91,3
Travesía Urbana Corrientes	650	473	72,8
Resto	1.008	577	57,3
Misiones	3.174	1.771	55,8
Construcción de Autovía en Ruta Nacional N°105, Tramo: Empalme rotonda R.N.12 (By Pass) - Empalme Rotonda R.N. 14 (San José)	709	910	128,3
Autopista Ruta Nacional N°12 Posadas - San Ignacio	1.310	430	32,8
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	104	83	79,6
Resto	1.051	349	33,2
La Pampa	2.648	990	37,4
Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	465	426	91,6
Malla 137 - Ruta Nacional N° 0151 - Provincia de La Pampa	271	239	88,2
Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa	305	210	69,1
Resto	1.607	114	7,1
Tucumán	6.007	1.569	26,1
Construcción de Redes Colectores - Alderetes - Banda del Río Salí - Provincia de Tucumán (PAYS II - BID 3451)	494	493	99,9
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	2.746	226	8,2
Construcción de Alto Nivel en Acceso a Trancas - Ruta Nacional N° 9 - Tramo: Int. R.P.N° 347 (El Cadillal) - Límite Tucumán / Salta	229	159	69,2
Resto			
Catamarca	2.936	722	24,6
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	103	116	112,7
Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca	282	109	38,6

Red de Mantenimiento 11° Distrito - Catamarca - Malla A (M11A)	205	101	49,1
Resto			
Santiago del Estero	2.267	933	41,2
Reconstrucción Ruta Nacional N° 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC/AR)	789	426	54,0
Realización de Cisternas - Provincia de Santiago del Estero (BIRF N° 8093-AR)	266	164	61,8
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	104	112	108,0
Resto	1.108	231	20,8
San Juan	2.056	805	39,1
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V	208	307	147,4
Ruta Nacional N°150 - Iglesia- Agua Negra- Sección: Las Flores - Peñasquito	436	159	36,5
Ampliación de Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y 3ª Etapa de Ampliación de Redes- Jáchal - San Juan	200	113	56,3
Resto	1.212	226	18,7
Jujuy	2.237	586	26,2
Corredor NOA: Autopistas Rutas Nacionales N° 34, 66 Y 1V66 Acceso a Salta - San Pedro de Jujuy - Sección IV (BIRF 8810)	895	213	23,9
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	82	125	151,7
Ruta Nacional N° 52, Tramo: Empalme Ruta Provincial N° 70 - Límite con Chile, Sección: Km.194,02 - Km. 257,06	269	64	24,0
Resto	992	184	18,5
Santa Cruz	4.480	350	7,8
Convenio TFO, Ruta Nacional N° 0003/0040/0281/0288/0293	169	99	59,0
Ruta Nacional N° 3; Tramo: Límite Chubut/Santa Cruz - Caleta Olivia; Sección: Prog. Km. 1855,91 - Prog. Km. 1871,10, Prog. Km.	432	99	23,0
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	91	76	83,2
Resto	3.789	75	2,0
Tierra del Fuego	10.707	212	2,0
Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de V	9.753	146	1,5
Red de Mantenimiento 24° Distrito - Tierra del Fuego Malla B (M24B)	43	33	75,9
Readecuación de ex Viviendas de Funcionarios para Instalación del Tribunal Oral de Ushuaia, Malvinas Argentinas 160	79	20	24,8
Resto	831	13	1,6
San Luis	992	473	47,7
Duplicación de calzada y pavimentación de colectoras, Ex Ruta Nacional N° 8, Tramo: Circunvalación - Acceso a Ciudad de Villa Mercedes	277	285	102,6

Equipo Básico para el Desarrollo de Tareas de Mantenimiento Llevadas Adelante por los 24 Distritos de la Dirección Nacional de Vialidad	58	108	184,5
Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	46	36	78,2
Resto	610	45	7,4
Sin región especificada (*)	29.856	6.827	22,9
Señalamiento y Telecomunicaciones (BID N°2982/OC-AR - BID N°5320/OC-AR)	2.472	1.081	43,7
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego	1.057	775	73,4
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales, Provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y Formosa	900	672	74,7
Resto	25.427	4.300	16,9
Total	259.109	95.919	37,0

(*) Incluye proyectos de inversión con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No clasificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Aspectos Metodológicos

- A los fines del presente informe se entiende por Inversión Pública a la sumatoria de la Inversión Real Directa (IRD) y las Transferencias de Capital (TC), principales componentes del gasto de capital. No se incluye la Inversión Financiera.
- La IRD está compuesta por los gastos destinados a la adquisición o a la producción por cuenta propia de bienes de capital. En el primer caso, se trata de bienes de capital terminados y cuya compra es realizada a terceros y adquirida luego por dicha unidad ejecutora, y se denomina adquisición de bienes de capital. En el segundo caso, donde la construcción del bien de capital es efectuada directamente por la unidad ejecutora del sector público o por propia cuenta mediante un contratista, se denomina proyecto de inversión. Por otro lado, las TC son gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras.
- El Informe de Ejecución Presupuestaria de la Inversión Pública corresponde a la Administración Pública Nacional, agregado jurisdiccional cuyo presupuesto es aprobado por ley del Congreso de la Nación.
- La Administración Pública Nacional incluye Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social.
- Los datos utilizados en la elaboración del informe provienen del Sistema Integrado de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda, siendo la fecha de corte el día 5 de julio de 2022.
- Para el cálculo de las variaciones reales se utiliza como deflactor la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Nivel General Nacional (INDEC).
- El momento de registro es el devengado, que considera al gasto en el momento en el que la transacción produce una obligación de pago, hay un cambio patrimonial y el crédito presupuestario es afectado en forma definitiva.

Publicaciones de la OPC

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación fue creada por la Ley 27.343 para brindar soporte al Poder Legislativo y profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones. Es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes abiertos a la ciudadanía. Este informe no contiene recomendaciones vinculantes.

www.opc.gob.ar

