



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Junio de 2020

Director General
Marcos Makón

Analistas
Maximiliano Geffner - Julieta Olivieri

08 de septiembre de 2020

ISSN 2683-9598

Índice de contenidos

Resumen Ejecutivo	3
Ejecución financiera de la Inversión Pública	4
Ejecución presupuestaria de la IP por función.....	5
Ejecución por ubicación geográfica	6
Ejecución financiera y física de la Inversión Real Directa	7
Análisis físico y financiero de los principales proyectos de inversión y sus obras.....	8
Análisis de la adquisición de bienes de capital.....	11
Ejecución financiera de las Transferencias de Capital	12
Transferencias de capital por destinatario.....	12
Ejecución de las transferencias de capital por región	13
Transferencias de capital a gobiernos subnacionales.....	14
Consideraciones Metodológicas	16
Fuentes de información.....	16
Alcance jurisdiccional.....	16
Definición de inversión pública	16
Anexos	17

Índice de cuadros

Cuadro 1. Composición de la Inversión Pública.....	5
Cuadro 2. Inversión pública por función	5
Cuadro 3. Inversión pública por región	6
Cuadro 4. Composición de la Inversión Real Directa.....	8
Cuadro 5. Proyectos de Inversión por región.....	9
Cuadro 6. Principales obras en proyectos de inversión.....	11
Cuadro 7. Principales adquisiciones de bienes de capital por Jurisdicción	12
Cuadro 8. Transferencias de capital por destinatario	13
Cuadro 9. Transferencias de capital por región	14
Cuadro 10. Transferencias de capital al Sector Público Subnacional por ubicación geográfica.....	15
Cuadro 11. Gastos de capital por Económico	17
Cuadro 12. Inversión Pública por Función	18
Cuadro 13. Inversión Real Directa por Función.....	19
Cuadro 14. Proyectos de Inversión por ubicación geográfica.....	20
Cuadro 15. Proyectos de Inversión por monto devengado	21
Cuadro 16. Principales obras en proyectos de inversión por ubicación geográfica	22
Cuadro 17. Transferencias de capital por función.....	28
Cuadro 18. Transferencias de capital por ubicación geográfica.....	29
Cuadro 19. Transferencias de capital a Instituciones Provinciales y Municipales.....	30

Índice de gráficos

Gráfico 1. Variación de la Inversión Pública	4
Gráfico 2. Comparativo de componentes de la Inversión Pública.....	5
Gráfico 3. Inversión Pública ejecutada por región geográfica y económico	6
Gráfico 4. Inversión Pública ejecutada por ubicación geográfica per cápita	7
Gráfico 5. Concentración de los Proyectos de Inversión.....	9
Gráfico 6. Distribución de obras por proyecto de Inversión.....	10

Resumen Ejecutivo

La inversión pública (IP) ejecutada en el primer semestre de 2020 ascendió a \$96.657 millones, lo cual representa una caída en términos reales¹ de 19,5% a/a (año contra año). Esto se explica por la retracción de 37,0% a/a de la inversión real directa (IRD) y de 3,9% de las transferencias de capital (TC), con lo que la inversión pública medida en proporción al gasto total (3,0%) y al PIB (0,34%) cayó en el primer semestre de 2020 con respecto a igual período del año anterior. La ejecución de la IP mostró elevada concentración en la Región Pampeana y en los gastos Interprovinciales.

La ejecución del gasto en IRD ascendió a \$35.704 millones en el primer semestre, de los cuales 82,6% correspondieron a proyectos de inversión y 17,4% a la adquisición de bienes de capital, con un nivel de ejecución de 31,0% y 29,1%, respectivamente. La IRD disminuyó 37,0% a/a en términos reales debido a la fuerte desaceleración de la ejecución de proyectos de inversión (42,8% a/a en términos reales) que no pudo ser compensada por los incrementos en la adquisición de bienes de capital (21,6% a/a en términos reales). Dichos proyectos, que a inicios del año presupuestario ascendían a 779, se redujeron a 744 proyectos con crédito vigente, aunque sólo 325 registraron ejecución en el primer semestre y en 12 de ellos se concentró el 50% del devengado total. Las adquisiciones de bienes de capital mostraron aceleración en la ejecución impulsadas por compras de equipamiento sanitario y de laboratorio del Ministerio de Salud con motivo de la pandemia y de equipo militar y de seguridad en defensa y seguridad interior.

La ejecución presupuestaria de TC ascendió a \$60.953 millones al primer semestre, demostrando una disminución en términos reales de 3,9% a/a, aunque con una mayor participación relativa en la IP respecto a la IRD en términos interanuales (63,1% de la IP en 2020, 52,8% de la IP en 2019). El 75,0% de las TC se concentraron en gastos con funciones de Agua Potable y Alcantarillado (50,4%), Vivienda y Urbanismo (10,3%), Salud (7,3%) y Ecología y Medio Ambiente (7,0%), mientras que desde el punto de vista de los beneficiarios se destacan las efectuadas a Otras Entidades del Sector Público Nacional (63,9%) e Instituciones Provinciales y Municipales (23,2%).

¹ Para el cálculo de las variaciones reales se utiliza como deflactor la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Nivel General Nacional (INDEC. Para el mes de junio 2020 se utilizó una estimación propia de OPC que prevé una variación mensual del 1,9%.

Ejecución financiera de la Inversión Pública


La inversión pública (IP)² ejecutada en el primer semestre de 2020 ascendió a \$96.657 millones, lo cual representa una caída en términos reales (19,5% a/a). Esto se explica por la fuerte retracción de 37,0% a/a de la inversión real directa (IRD), y de 3,9% de las transferencias de capital (TC) con lo que la inversión pública medida en proporción al gasto total (3,0%) y al PIB (0,34%) cayó en el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo período de un año atrás. La ejecución de la IP mostró elevada concentración en la Región Pampeana, principalmente en CABA y PBA, y además se concentró en los gastos Interprovinciales.

La ejecución presupuestaria de la inversión pública de la Administración Pública Nacional (APN) alcanzó \$96.657 millones en el primer semestre de 2020 lo que representó una disminución de -19,5% a/a en términos reales. Este comportamiento capta los efectos de la pandemia COVID-19 que generó una merma generalizada en la actividad económica en general, con atrasos y suspensiones en la ejecución de obras por parte del gobierno nacional.

Como resultado, en el primer semestre de 2020 disminuyó la participación de la IP en el total de gastos de la APN, pasando de 4,1% a 3,0%, mientras que en términos del PIB cayó en menor medida de 0,38% a 0,34%.

Gráfico 1. Variación de la Inversión Pública

Acumulado a junio. En millones de \$, en % del gasto total y en % del PIB

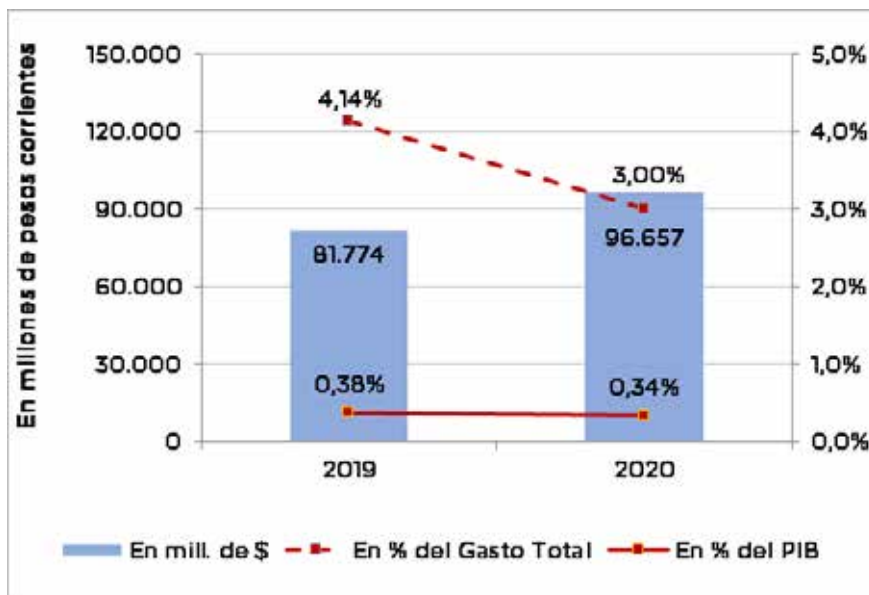

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif, INDEC (PIB 2019) y OPC (estimación PIB 2020).

Los componentes de la IP cambiaron su participación relativa en el período como resultado de la diferencia en la intensidad de sus caídas por lo que las TC pasaron de aportar el 52,8% a explicar el 63,1% de la misma en desmedro de la IRD. Esto se explica en parte por el diferente grado de ejecución que fue mayor para las TC (40,3%) que para la IRD (30,6%).

² Ver Definición de inversión pública en Consideraciones Metodológicas.

Cuadro 1. Composición de la Inversión Pública


Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Componente de IP	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Inversión Real Directa	116.613	35.704	30,6	-37,0
Transferencias de Capital	151.312	60.953	40,3	-3,9
Total	267.924	96.657	36,1	-19,5

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Gráfico 2. Comparativo de componentes de la Inversión Pública

Acumulado a junio. En % del total de IP

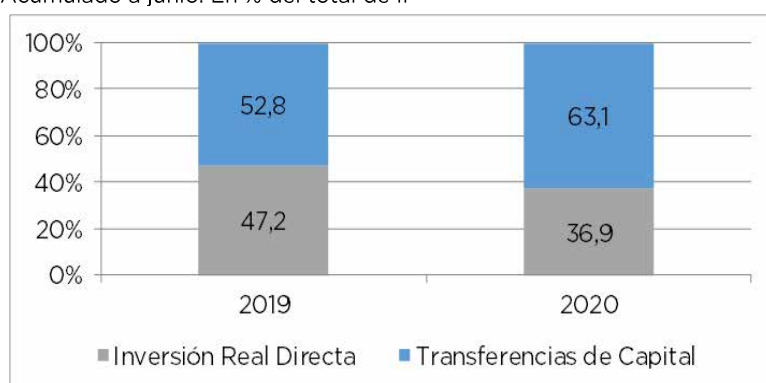

Estas variaciones se relacionan con la caída generalizada en la actividad por la pandemia COVID-19, con atrasos y suspensiones en la ejecución de obras respecto de la IRD.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución presupuestaria de la IP por función

En la primera mitad del año 2020, la IP devengada se canalizó mayormente hacia obras de Agua Potable y Alcantarillado, casi triplicando su importancia relativa. De esta manera, desplazó al segundo lugar a la IP en Transporte que tradicionalmente lidera estos gastos y cuyo crédito vigente para este año sigue ocupando el primer lugar y representa un 34,2% del total. En comparación con igual período de 2019 se incrementó además fuertemente la participación de la IP en Salud y se redujo también de forma sustantiva, inclusive en términos nominales, la participación de la IP en Vivienda y Urbanismo, tradicionalmente en segundo lugar (ver Cuadro 12 en Anexo).

Cuadro 2. Inversión pública por función

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Función	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Agua Potable y Alcantarillado	44.785	31.527	70,4	123,1
Transporte	91.678	27.229	29,7	-46,9
Salud	14.021	8.454	60,3	2.872,8
Vivienda y Urbanismo	39.495	6.298	15,9	-71,8
Ecología y Medio Ambiente	10.746	4.668	43,4	2,0
Energía, Combustibles y Minería	14.280	4.231	29,6	-26,0
Resto	52.919	14.249	26,9	-34,6
Total	267.924	96.657	36,1	-19,5

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Ejecución por ubicación geográfica

La dimensión regional de la ejecución presupuestaria de la IP en el primer semestre de 2020 mantuvo una alta concentración en las regiones Pampeana (46,5% del total) y del Noroeste (NOA, 10,0% del total). Aunque el nivel de ejecución presupuestaria de la IP del período en relación con los créditos vigentes es inferior en la comparación interanual (36,1% en 2020, 42,9% en 2019), las regiones mencionadas mostraron mayor ejecución (38,8% y 37,8%, respectivamente) que el promedio para el total de la IP (36,1%). Sin embargo, en la comparación interanual todas las regiones identificables por la ubicación geográfica de la ejecución presupuestaria cedieron participación en 2020 a favor de la IP sin región especificada³, que en su mayor parte se compone de transferencias de capital.

Cuadro 3. Inversión pública por región

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Región	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
PAMPEANA	115.675	44.937	38,8	-24,5
NOA	25.529	9.653	37,8	-36,6
PATAGONIA	19.945	7.109	35,6	-29,5
NEA	15.558	5.296	34,0	-40,0
CUYO	11.899	3.989	33,5	-28,5
Sin región especificada (*)	79.318	25.672	32,4	23,1
Total	267.924	96.657	36,1	-19,5


(*) Incluye gastos de IP con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No especificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

En cuanto a los componentes de la IP, su participación relativa difiere por regiones. En los extremos, las provincias que componen la región de Cuyo captaron más inversión real directa que transferencias de capital, mientras que aquellos gastos sin región especificada consistieron en su mayor parte (89,6%) de transferencias de capital. En las regiones NEA, Patagónica, Pampeana, y NOA la relación resultó más balanceada, en orden decreciente de participación de la IRD.

Gráfico 3. Inversión Pública ejecutada por región geográfica y económico

Acumulado a junio. En % del total de IP

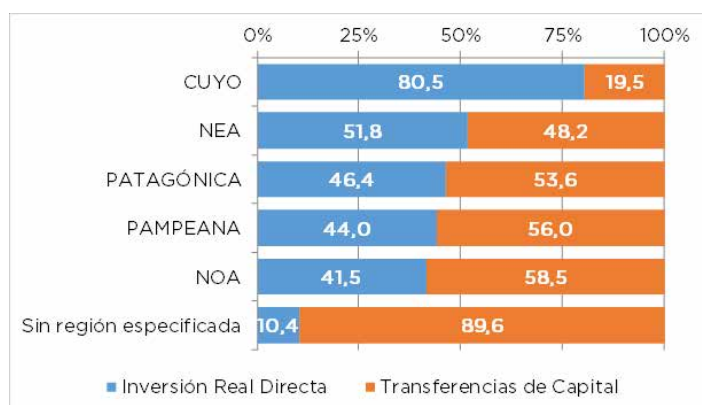


FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

³ Se agruparon bajo esta denominación a los gastos cuya ubicación geográfica es de alcance o impacto Interprovincial, Nacional, Binacional y No especificado.

Dado que el objetivo de la IP es la reparación o el mejoramiento de un activo físico existente o la incorporación de uno nuevo al patrimonio, la dimensión geográfica permite asociar a la población de las provincias en que se registra el gasto como aproximación de los potenciales beneficiarios de la IP. De esta forma, es posible construir un indicador de inversión pública per cápita como el gasto en IP por ubicación geográfica en razón de la población de cada provincia a fin de normalizar el gasto por la cantidad de habitantes en el destino de la IP⁴. El indicador construido para el primer semestre de 2020 presenta heterogeneidades marcadas como es habitual, con un mínimo de \$435 por habitante en el caso de San Luis y un máximo de \$8.335 por habitante en el caso de CABA, con un promedio a nivel nacional de \$2.130 por habitante, lo cual implica una caída de 20,3% respecto de igual período en 2019 en términos reales.

Gráfico 4. Inversión Pública ejecutada por ubicación geográfica per cápita

Acumulado a junio. En \$ por habitante

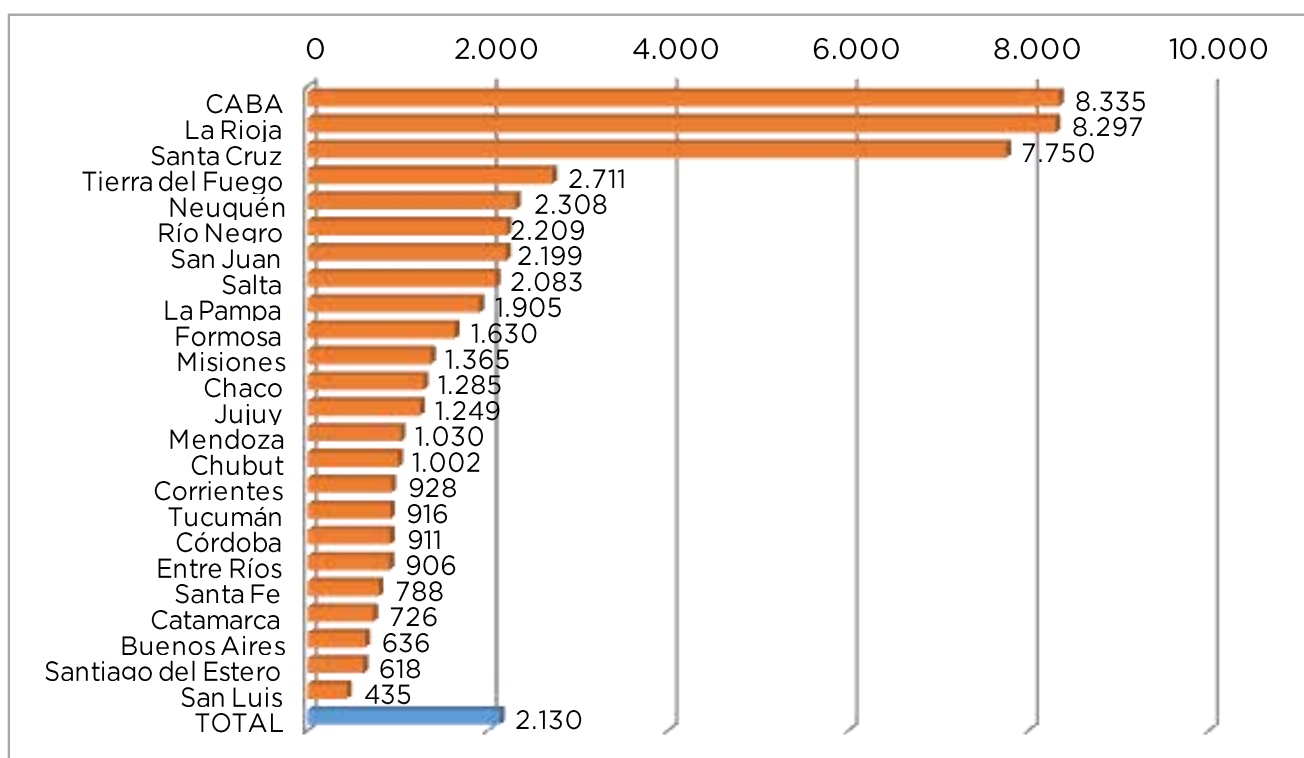

FUENTE: OPC en base a datos E. Sidif.

Ejecución financiera y física de la Inversión Real Directa

La ejecución del gasto en IRD ascendió a \$35.704 millones en el primer semestre, de los cuales **82,6%** correspondieron a proyectos de inversión y **17,4%** a la adquisición de bienes de capital, con un nivel de ejecución de **31,0%** y **29,1%**, respectivamente. La IRD disminuyó **37,0%** a/a en términos reales debido a la fuerte desaceleración de la ejecución de proyectos de inversión (**42,8%** a/a en términos reales) que no pudo ser compensada por los incrementos en la adquisición de bienes de capital (**21,6%** a/a en términos reales). Dichos proyectos, que a inicios del año presupuestario ascendían a **779**, se redujeron a **744** proyectos con crédito vigente⁵ por un monto de **\$95.214**

⁴ Cabe aclarar que el registro del gasto devengado por ubicación geográfica es de carácter indicativo. Ello podría estar sujeto a errores de imputación por parte de las unidades ejecutoras responsables en el caso de la adquisición de bienes de capital.

⁵ Es importante destacar que al prorrogarse el presupuesto del ejercicio 2019 se trasladaron al ejercicio vigente proyectos de inversión que habían finalizado durante el ejercicio anterior.

millones. El 50% de los gastos devengados en el primer semestre destinados a proyectos de inversión se concentraron en 12 proyectos. Las adquisiciones de bienes de capital mostraron aceleración en la ejecución impulsadas por compras de equipamiento sanitario y de laboratorio del Ministerio de Salud con motivo de la pandemia y de equipo militar y de seguridad en defensa y seguridad interior.

La ejecución del gasto en IRD de la APN totalizó \$35.704 millones en el primer semestre 2020, de los cuales \$29.478 millones (82,6%) correspondieron a Proyectos de Inversión y \$6.226 millones (17,4%) a adquisiciones de bienes de capital, como se observa en el Cuadro 4. Esto implica un nivel de ejecución de 31,0% y 29,1%, respectivamente, que representan una fuerte caída total de 37,0% a/a en términos reales en buena parte asociada a los efectos de la reducción en la movilidad y la actividad económica por la pandemia COVID-19.

Cuadro 4. Composición de la Inversión Real Directa

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Concepto	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Proyectos de inversión	95.214	29.478	31,0	-42,8
Adquisiciones de Bs. de capital	21.399	6.226	29,1	21,6
Total	116.613	35.704	30,6	-37,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Análisis físico y financiero de los principales proyectos de inversión y sus obras

El total de proyectos de inversión en 2020 asciende a 744 por un total de \$95.214 millones de crédito vigente, de los que 325 ejecutaron un total de \$29.478 millones al cierre del primer semestre 2020. La distribución de proyectos respecto al presupuesto vigente y el gasto devengado presenta habitualmente un alto grado de concentración: pocos proyectos acumulan la mayor parte del gasto en proyectos de inversión mientras que la gran mayoría contribuye marginalmente. En el período de análisis sólo 12 proyectos de los 325 acumularon el 50% del total de gastos devengados en este concepto.

En términos regionales, la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión se focalizó en la región Pampeana (46,4%), concentradas en CABA, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, seguidas por NOA y Patagonia, que incluyeron importantes obras en Salta y en Río Negro y Neuquén, respectivamente. Sin embargo, el nivel de ejecución más alto se registró en Cuyo (54,0%) y, en el otro extremo quedaron los gastos Sin región especificada (13,6%). Esto explica la tasa de variación real positiva en el primer caso (3,1% a/a) y la tasa negativa en el segundo (75,8% a/a).

Cuadro 5. Proyectos de Inversión por región

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Región	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
PAMPEANA	45.052	13.671	30,3	-40,5
NOA	9.887	3.979	40,2	-24,9
PATAGONIA	7.521	3.265	43,4	-37,4
CUYO	5.924	3.200	54,0	3,1
NEA	7.402	2.726	36,8	-33,0
Sin región especificada (*)	19.429	2.637	13,6	-75,8
Total	95.214	29.478	31,0	-42,8


(*) Incluye gastos de IP con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No especificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Los proyectos de inversión pueden articularse en más de una obra, aunque en su mayoría (96,4% del total de proyectos) se trata de proyectos de una sola obra. Así, los 744 proyectos con crédito vigente a junio incluyeron un total de 785 obras. La concentración de obras sigue un patrón similar a la de proyectos y en el primer semestre sólo 13 de estas 785 obras capturaron el 50% de la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión (Cuadro 6).

Gráfico 5. Concentración de los Proyectos de Inversión


Acumulado a junio. En % acumulado del gasto

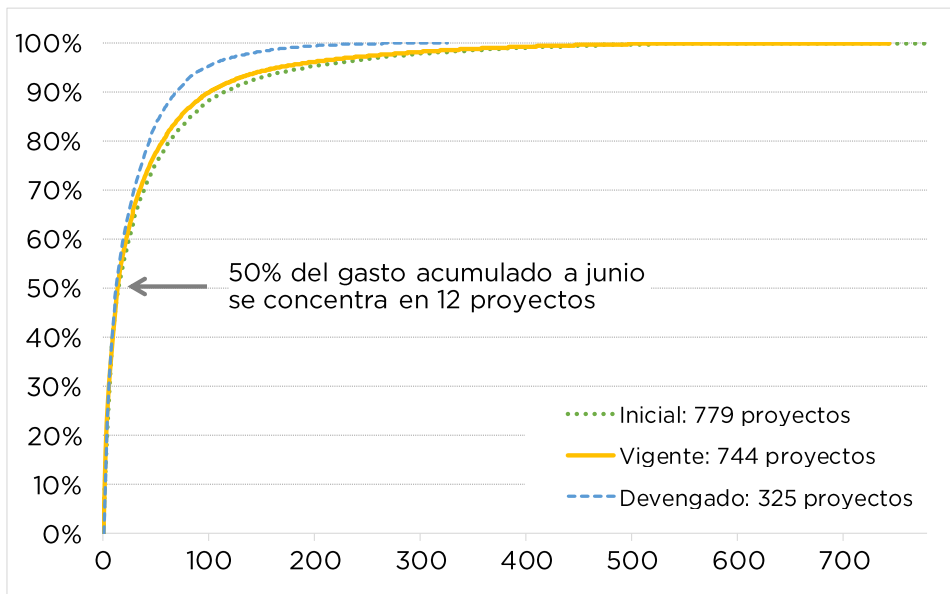

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Gráfico 6. Distribución de obras por proyecto de Inversión

Acumulado a junio. En cantidad y en % acumulado

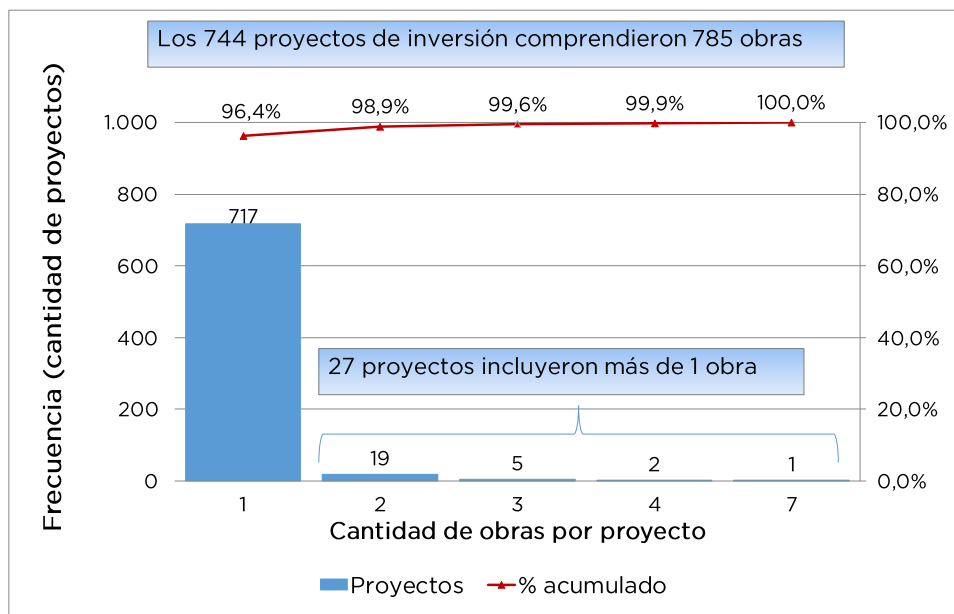

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Este grupo de obras con mayor ejecución resultaron prácticamente en su totalidad de la función Transporte, que incluyen más de 7 obras de autopistas, Renovación de Vías y Corredor del FC Gral. Belgrano Cargas, y Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Adicionalmente figura un proyecto de la función Energía, de Construcción del Reactor de Baja Potencia CAREM – Fase II a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

La desagregación en obras permite ver el grado de avance físico⁶ de cada una de ellas. La mayoría de las principales obras presentó un grado de ejecución física bajo en el primer semestre⁷ superando en sólo dos casos el 10%: la Crema Malla 409A (20,7% sobre una programación para el semestre de 21,2%) y el Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias (50% sobre 100%). En el primer caso el avance semestral está en un nivel cercano a lo programado para el año, en el segundo, alcanza a la mitad de la programación. De las otras 11 obras, sólo 2 presentaron un grado de ejecución física cercano al 8/9%, mientras que en las 9 restantes el nivel de avance físico fue inferior al 5%. Hay que destacar que entre las principales 5 obras, sólo la Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM tuvo un avance relevante para el primer semestre (casi un tercio de la programación). En Cuadro 17 de Anexo se presentan las principales obras en proyectos de inversión por ubicación geográfica con el avance físico y financiero.

⁶ Los datos de avance físico considerados en este informe corresponden a lo informado hasta el 2 de septiembre de 2020.

⁷ La información de avance físico presenta 96 obras sin información (s/i) acumulada al 30 de junio de 2020.

Cuadro 6. Principales obras en proyectos de inversión

Acumulado a junio. En millones de \$, % acumulado y % de ejecución

Proyecto	Ubicación geográfica	Ejecución financiera			Ejecución física (%)	
		Vigente	Devengado	% ac.	Prog. a junio	Ejec. a junio
Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino	PBA	8.118	2.238	7,6	24,3	3,4
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	CABA-PBA	2.277	2.227	15,1	2,2	0,6
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	NOA-NEA-SFE	6.032	2.029	22,0	21,6	0,6
Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)	CBA	2.483	1.453	27,0	31,8	4,5
Autopistas Acceso San Juan	SNJ	1.895	1.322	31,4	46,1	3,4
Autopista Camino del Buen Ayre	PBA	5.446	974	34,8	23,6	1,4
Autopista Ruta Nacional N° 7 Lujan - Junín	PBA	3.553	939	37,9	14,6	2,4
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Lujan de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	MZA	1.119	894	41,0	68,5	8,9
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias	Varias	2.523	637	43,1	100,0	50,0
Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones	MIS	1.242	579	45,1	24,6	7,9
Autopista Ruta Nacional N° 34 Angelica - Sunchales	SFE	2.407	520	46,9	17,4	2,7
Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	TUC	916	498	48,5	21,2	20,7
Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias	JUY	865	483	50,2	62,5	1,6
Resto - 772 obras (*)	Varias	56.336	14.685	100,0	n.c.	n.c.
Total - 785 obras (*)		95.214	29.478		n.c.	n.c.

(*) Obras con crédito vigente no nulo

(n/c): no corresponde.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Análisis de la adquisición de bienes de capital

Las adquisiciones de bienes de capital ascendieron a \$6.226 millones en el período, empujadas por las compras de equipo sanitario y de laboratorio del Ministerio de Salud en respuesta a acciones realizadas en el marco de la pandemia (\$3.860 millones). En segundo lugar, se destacaron las compras de equipo militar y de seguridad (\$916 millones) llevadas a cabo principalmente por el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (\$650 millones), el Ministerio de Seguridad (\$211 millones), Gendarmería Nacional (\$30 millones) y Prefectura Naval Argentina (\$15 millones). En menor orden de importancia se registraron adquisiciones de herramientas y repuestos mayores (\$150 millones) y restantes adquisiciones de equipos, programas de computación y maquinarias (\$327 millones).

Cuadro 7. Principales adquisiciones de bienes de capital por Jurisdicción

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Jurisdicción	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Ministerio de Salud	5.739	3.909	68,1	5.968,6
Ministerio de Defensa	2.630	712	27,1	-23,7
Ministerio de Seguridad	1.627	666	40,9	-26,6
Resto	11.403	938	8,2	-70,8
Total	21.399	6.226	29,1	21,6

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

El nivel de ejecución del Ministerio de Salud (68,1%) superó el promedio, mientras que las jurisdicciones agrupadas en Resto sólo ejecutaron un 8,2% del crédito vigente. Las variaciones reales negativas en la mayoría de los casos fueron compensadas por el aumento en el Ministerio de Salud, a partir de las adquisiciones efectuadas para enfrentar la pandemia por COVID-19.

Ejecución financiera de las Transferencias de Capital

La ejecución presupuestaria de TC ascendió a \$60.953 millones, demostrando una disminución en términos reales de 3,9% a/a. En el primer semestre se observó una mayor utilización relativa de estos gastos respecto a la IRD en términos interanuales (63,1% de la IP en 2020, 52,8% de la IP en 2019). El 75,0% de las TC se concentraron en gastos con funciones de Agua Potable y Alcantarillado (50,4%), Vivienda y Urbanismo (10,3%), Salud (7,3%) y Ecología y Medio Ambiente (7,0%)⁸. Los beneficiarios mayoritarios de estas transferencias fueron Otras Entidades del Sector Público Nacional (63,9%), dentro de las que se destaca AYSA S.A., e Instituciones Provinciales y Municipales (23,2%).

Transferencias de capital por destinatario

En contraste con la IP realizada mediante proyectos de inversión y adquisición de equipamiento que requieren de un intercambio entre agencia gubernamental y proveedor, las TC reflejan transacciones que no requieren contraprestación por parte del beneficiario, aunque le trasladan la obligación de aplicarlas al financiamiento de gastos que incrementarán su patrimonio.

En el primer semestre la APN realizó TC por \$60.953 millones, destinadas principalmente a otras entidades del Sector Público Nacional (SPN, 63,9%) y a instituciones Provinciales y Municipales (23,2%). Las TC destinadas a instituciones del resto del SPN se incrementaron en términos reales (13,9% a/a) y se concentraron principalmente en AYSA S.A. (58,6%), el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (13,6%), la empresa Integración Energética Argentina S.A. (7,6%), Ex-ENARSA S.A., y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (7,1%). Mientras que las transferencias a instituciones de gobiernos subnacionales disminuyeron en términos reales (-48,9% a/a), las transferencias al exterior aumentaron considerablemente, debido a los gastos del programa de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria del Ministerio de Obras Públicas, de Asistencia Financiera para la Construcción de Hospitales Modulares de Emergencia⁹ en relación con la pandemia COVID-19.

⁸ Ver en Cuadro 17 en Anexo la distribución funcional completa de estos gastos.

⁹ Los hospitales modulares se realizaron por un convenio con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por esta razón se registraron como transferencias al exterior.

Cuadro 8. Transferencias de capital por destinatario

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Destinatario	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
Otras Entidades del SPN	84.046	38.956	46,4	13,9
Empresas Públicas	55.907	28.796	51,5	29,4
Fondos Fiduciarios y Otros Entes	28.033	10.160	36,2	-14,9
Instituciones Públicas Financieras	105	0	0,0	-100,0
Provincias y Municipios	51.223	14.118	27,6	-48,9
Instituciones Provinciales	37.123	13.054	35,2	-42,8
Instituciones Municipales	14.100	1.065	7,6	-77,8
Exterior	5.905	4.368	74,0	55.184,8
Sector Privado	8.887	3.151	35,5	237,9
Instituciones Culturales y Sociales	3.844	2.255	58,7	1.372,3
Actividades Científicas o Académicas	948	359	37,9	49,7
Cooperativas	1.195	299	25,0	104,5
Empresas Privadas	2.800	188	6,7	-51,7
Personas	100	50	50,1	1.026,3
Universidades Nacionales	1.251	360	28,8	-48,7
Total	151.312	60.953	40,3	-3,9

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Se destacan por el nivel de ejecución alcanzado las TC al exterior (74,0%) y en el extremo opuesto las efectuadas a Instituciones Públicas Financieras no registraron ejecución. Registran bajos niveles de ejecución las transferencias a Empresas Privadas (6,7%) y a Instituciones Municipales (7,6%).

Ejecución de las transferencias de capital por región

Desde el punto de vista del impacto regional de las transferencias, cuyo resultó la región menos favorecida, con la menor asignación de TC. El nivel de ejecución alcanzado al primer semestre resultó del 13,1% y la caída interanual fue la mayor con relación a la registrada para las demás regiones, con el 66,0% a/a en términos reales. En otro extremo la región Pampeana, que capta la mayor distribución asignable por regiones en el presupuesto total de TC, alcanzó 47,6% de ejecución y soportó una caída en términos reales de 21,6% a/a. No obstante, la ejecución con ubicación geográfica Interprovincial, utilizada para afectar gastos que pueden asignarse a dos o más provincias, representó el 28,5% del total de las TC (ver Cuadro 18 en Anexo) con lo que las transferencias registradas para cada provincia y región subestiman la IP en cada unidad geográfica.

Cuadro 9. Transferencias de capital por región

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Región	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
PAMPEANA	52.917	25.165	47,6	-21,6
NOA	15.624	5.649	36,2	-42,0
PATAGONIA	12.334	3.811	30,9	-18,2
NEA	8.138	2.553	31,4	-46,2
CUYO	5.933	778	13,1	-66,0
Sin región especificada (*)	56.367	22.998	40,8	131,8
Total	151.312	60.953	40,3	-3,9

(*) Incluye gastos de IP con ubicación geográfica Interprovincial, Nacional, Binacional y No especificada.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Transferencias de capital a gobiernos subnacionales

El total de gastos de IP transferidos por la Nación en el período a instituciones provinciales y municipales para financiar gastos de capital sumó \$14.118 millones, que representó una disminución de 48,9% a/a en términos reales. La mayor parte de estos gastos correspondieron a la transferencia de recursos para obras hídricas en provincias y municipios (\$5.969 millones) realizadas por el ENOHSa (\$3.182 millones) y el Ministerio de Obras Públicas mediante el programa de Recursos Hídricos (\$1.205 millones). En segundo lugar, el Ministerio de Educación realizó transferencias a instituciones subnacionales (\$3.156 millones) para Infraestructura y Equipamiento, Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica, y Fortalecimiento Edificio de Jardines Infantiles. Por otro lado, también se destacaron las transferencias del Tesoro Nacional a la provincia de La Rioja por obligaciones de convenio con el Estado Nacional (\$2.787 millones) y de la Dirección Nacional de Vialidad a gobiernos subnacionales para Construcciones de Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (\$1.205 millones).

El nivel de ejecución del total de TC a gobiernos subnacionales llegó al 27,6%, por debajo del promedio del total de TC (40,3%). La Pampa sobresale entre las distintas ubicaciones geográficas (UG) con 242,1% y otras 7 UG superaron el 50,0%. En el otro extremo, 5 UG tuvieron un grado de ejecución inferior al 10,0%. La mayoría de ellas presentó una tasa de variación real interanual negativa inferior a 40,0% a/a, y sólo 3 UG vieron aumentar el gasto devengado en términos reales: La Pampa (251,5% a/a), Tucumán (38,6% a/a) y Santa Fe (18,1% a/a).

Cuadro 10. Transferencias de capital al Sector Público Subnacional por ubicación geográfica

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Ubicación geográfica	Vigente	Devengado	% de ejecución	Var. % real a/a
La Rioja	4.357	2.877	66,0	-14,8
Buenos Aires	5.824	1.148	19,7	-67,3
Córdoba	1.736	1.047	60,3	-59,4
Salta	2.941	951	32,3	-63,2
Tucumán	1.282	932	72,7	38,6
Entre Ríos	1.005	876	87,1	-3,0
Santa Fe	885	770	87,1	18,1
Chaco	1.631	692	42,4	-50,3
Misiones	1.890	685	36,3	-45,2
Mendoza	2.078	664	31,9	-39,1
La Pampa	228	552	242,1	251,5
Neuquén	1.757	475	27,1	-61,0
Formosa	572	397	69,3	-29,0
Corrientes	1.030	387	37,5	-59,8
Santiago del Estero	1.905	323	17,0	-72,3
Jujuy	993	314	31,6	-53,1
Río Negro	993	263	26,5	-57,4
Catamarca	1.136	213	18,7	-79,4
CABA	5.250	204	3,9	-84,7
Tierra del Fuego	330	167	50,5	-49,0
San Juan	2.254	75	3,3	-92,6
Chubut	433	48	11,0	-81,4
San Luis	445	37	8,4	-70,1
Santa Cruz	380	21	5,5	-87,4
Otras	9.889	0	0,0	-
Total	51.223	14.118	27,6	-48,9

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Consideraciones Metodológicas

Fuentes de información

La información analizada en este informe ha sido tomada del Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) de la Secretaría de Hacienda y del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) administrado por la Dirección Nacional de Inversión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El momento de registro es el devengado, que considera al gasto en el momento en el que la transacción produce una obligación de pago, hay un cambio patrimonial y el crédito presupuestario es afectado en forma definitiva. La fecha de corte de la base de datos E.Sidif considerada para realizar este informe fue el 6 de julio de 2020.

Para las estimaciones de variaciones reales y en términos del Producto Bruto Interno, se utilizaron las estadísticas oficiales publicadas por el INDEC y estimaciones de la OPC.

Alcance jurisdiccional

El presente informe analiza la inversión pública a partir del universo institucional comprendido en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156, que establece que la Administración Pública Nacional está conformada por la Administración Central y los Organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad Social.

Definición de inversión pública

Se entiende como inversión pública a la sumatoria de la *inversión real directa* y las *transferencias de capital*, principales componentes del gasto de capital.

A su vez, la IRD está compuesta por los gastos destinados a la adquisición o a la producción por cuenta propia de bienes de capital. En el primer caso, se trata de bienes de capital terminados y cuya compra es realizada a terceros y adquirida luego por dicha unidad ejecutora, y se denomina adquisición de bienes de capital. En el segundo caso, donde la construcción del bien de capital es efectuada directamente por la unidad ejecutora del sector público o por propia cuenta mediante un contratista, se denomina proyecto de inversión.

Por otro lado, las transferencias de capital son gastos sin contraprestación, con el objeto de que los diferentes agentes económicos públicos, privados o externos beneficiarios, se capitalicen mediante inversiones reales o financieras.

Anexos

Cuadro 11. Gastos de capital por Económico

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución, % del PIB y % de var real a/a

Función	2019	2020		Var. % real a/a	
	Devengado	Vigente	Devengado		% de ejecución
En millones de pesos corrientes					
GASTOS DE CAPITAL	88.721	302.837	113.708	37,5	-12,8
Inversión Pública	81.774	267.924	96.657	36,1	-19,5
Inversión Real Directa	38.588	116.613	35.704	30,6	-37,0
Proyectos de inversión	35.103	95.214	29.478	31,0	-42,8
Adquisición de bienes de capital	3.485	21.399	6.226	29,1	21,6
Transferencias de Capital	43.186	151.312	60.953	40,3	-3,9
Inversión Financiera	6.947	34.913	17.051	48,8	67,1
En % PIB					
GASTOS DE CAPITAL	0,41	1,06	0,40		
Inversión Pública	0,38	0,94	0,34		
Inversión Real Directa	0,18	0,41	0,13		
Proyectos de inversión	0,16	0,33	0,10		
Adquisición de bienes de capital	0,02	0,08	0,02		
Transferencias de Capital	0,20	0,53	0,21		
Inversión Financiera	0,03	0,12	0,06		

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif, INDEC y OPC.

Cuadro 12. Inversión Pública por Función

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Función	2019	2020			Var. % real a/a
	Devengado	Vigente	Devengado	% de ejecución	
Agua Potable y Alcantarillado	9.618	44.785	31.527	70,4	123,1
Transporte	34.894	91.678	27.229	29,7	-46,9
Salud	194	14.021	8.454	60,3	2.872,8
Vivienda y Urbanismo	15.218	39.495	6.298	15,9	-71,8
Ecología y Medio Ambiente	3.117	10.746	4.668	43,4	2,0
Energía, Combustibles y Minería	3.892	14.280	4.231	29,6	-26,0
Educación y Cultura	5.036	11.573	4.012	34,7	-45,8
Ciencia y Técnica	2.210	7.789	3.812	48,9	17,4
Relaciones Interiores	2.388	6.282	2.863	45,6	-18,4
Defensa	619	2.743	732	26,7	-19,5
Seguridad Interior	608	1.865	700	37,5	-21,7
Sistema Penal	335	2.046	526	25,7	7,1
Promoción y Asistencia Social	1.044	7.535	458	6,1	-70,1
Agricultura	476	2.284	364	15,9	-47,9
Seguridad Social	303	1.313	118	9,0	-73,4
Comunicaciones	614	925	115	12,4	-87,3
Comercio, Turismo y Otros Servicios	247	1.974	115	5,8	-68,3
Dirección Superior Ejecutiva	444	1.007	101	10,0	-84,5
Judicial	76	958	97	10,1	-12,8
Industria	56	1.728	92	5,3	10,8
Administración Fiscal	16	1.023	54	5,3	124,8
Legislativa	27	156	28	18,2	-27,7
Trabajo	65	521	26	4,9	-73,1
Relaciones Exteriores	11	106	22	20,5	33,2
Seguros y Finanzas	6	73	7	9,5	-21,7
Control de la Gestión Pública	12	48	5	10,0	-71,5
Información y Estadística Básicas	249	371	2	0,7	-99,3
Inteligencia	0	599	0	0,0	-100,0
Total	81.774	267.924	96.657	36,1	-19,5

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 13. Inversión Real Directa por Función

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Función	2019	2020			Var. % real a/a
	Devengado	Vigente	Devengado	% de ejecución	
Transporte	29.924	78.352	24.269	31,0	-44,8
Salud	138	5.773	4.004	69,4	1.872,7
Ciencia y Técnica	1.852	6.866	3.483	50,7	28,1
Agua Potable y Alcantarillado	984	1.989	830	41,7	-42,6
Defensa	619	2.669	732	27,4	-19,5
Seguridad Interior	608	1.836	677	36,8	-24,3
Ecología y Medio Ambiente	263	1.742	415	23,8	7,2
Educación y Cultura	1.206	2.920	373	12,8	-78,9
Sistema Penal	223	979	174	17,7	-46,9
Seguridad Social	303	1.313	118	9,0	-73,4
Dirección Superior Ejecutiva	444	1.007	101	10,0	-84,5
Judicial	76	958	97	10,1	-12,8
Agricultura	124	813	90	11,1	-50,4
Relaciones Interiores	216	685	76	11,1	-76,1
Comercio, Turismo y Otros Servicios	172	474	55	11,6	-78,2
Administración Fiscal	16	627	54	8,6	124,8
Promoción y Asistencia Social	63	3.093	51	1,7	-44,4
Legislativa	27	156	28	18,2	-27,7
Relaciones Exteriores	11	106	22	20,5	33,2
Energía, Combustibles y Minería	950	2.439	18	0,7	-98,7
Trabajo	50	389	12	3,1	-83,7
Comunicaciones	13	46	8	17,8	-57,3
Seguros y Finanzas	6	73	7	9,5	-21,7
Control de la Gestión Pública	12	48	5	10,0	-71,5
Industria	42	146	3	1,7	-95,9
Información y Estadística Básicas	249	371	2	0,7	-99,3
Inteligencia	0	599	0	-	-100,0
Total	38.588	116.470	35.704	30,6	-37,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 14. Proyectos de Inversión por ubicación geográfica

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Ubicación geográfica	2019	2020				Var. % real a/a
	Devengado	Vigente	Devengado	% de ejecución	Gasto per cápita	
Buenos Aires	8.807	27.291	6.010	22,0	343	-53,5
CABA	1.955	4.740	3.044	64,2	990	6,0
Córdoba	2.106	4.278	2.143	50,1	570	-30,7
Salta	1.221	1.031	2.007	194,7	1.409	11,9
Santa Fe	2.031	6.681	1.978	29,6	559	-33,7
San Juan	536	2.760	1.640	59,4	2.099	108,1
Mendoza	1.312	2.602	1.377	52,9	692	-28,5
Río Negro	1.097	2.695	1.230	45,7	1.646	-23,6
Neuquén	1.071	1.910	1.048	54,9	1.578	-33,4
Misiones	692	1.888	943	49,9	747	-7,3
Chaco	1.022	2.918	794	27,2	659	-47,2
Jujuy	615	1.194	644	53,9	835	-28,7
Corrientes	598	1.440	637	44,3	569	-27,4
Tucumán	287	4.839	592	12,2	349	40,5
Chubut	707	1.525	569	37,3	920	-45,2
La Rioja	479	1.419	385	27,1	977	-45,3
Entre Ríos	563	1.439	369	25,6	266	-55,4
Formosa	459	1.156	353	30,5	583	-47,7
Tierra del Fuego	594	945	302	31,9	1.740	-65,4
Santiago del Estero	733	962	278	28,9	284	-74,2
San Luis	266	562	183	32,5	360	-53,1
La Pampa	184	622	127	20,5	356	-52,7
Santa Cruz	82	445	115	26,0	316	-4,6
Catamarca	274	443	75	16,9	180	-81,5
Interprovincial	6.851	13.662	2.061	15,1	n.c.	-79,5
Nacional	442	5.452	523	9,6	12	-19,4
Binacional	1	0	0	-	n.c.	-100,0
No Clasificado	120	315	53	16,7	n.c.	-70,1
Total	35.103	95.214	29.478	31,0	650	-42,8

(n/c): no corresponde.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 15. Proyectos de Inversión por monto devengado

Acumulado a junio. En millones de \$, en % acumulado y en % de ejecución

Rango de montos	Vigente				Devengado				% de ejecución
	\$	%	Cant.	%	\$	%	Cant.	%	
Hasta \$10 mill.	1.171	1,2	400	53,8	491	1,7	175	53,8	41,9
Entre \$10 y \$100 mill.	7.106	7,5	233	31,3	3.096	10,5	89	27,4	43,6
Entre \$100 y \$300 mill.	9.968	10,5	53	7,1	6.795	23,0	38	11,7	68,2
Entre \$300 y \$1000 mill.	21.611	22,7	39	5,2	9.631	32,7	18	5,5	44,6
Mayor a \$1.000 mill.	55.359	58,1	19	2,6	9.467	32,1	5	1,5	17,1
Total	95.214	100,0	744	100,0	29.478	100,0	325	100,0	31,0

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif y BAPIN.

Cuadro 16. Principales obras en proyectos de inversión por ubicación geográfica

Acumulado a junio. Ejecución financiera y física. En millones de \$, en % acumulado y en % de ejecución física

Obras en proyectos de inversión	Ejecución financiera			Ejecución física (%)	
	Vigente	Devengado	% ac.	Prog. a junio	Ejec. a junio
Ciudad Autónoma de Buenos Aires					
Construcción de Reactor de Baja Potencia CAREM - Fase II	1.189	2.225	73,1		2,2
Saneamiento Agua y Cloacas-Barrios Tres Rosas, San Blas (Villa 21/24) (BIRF N°7706-AC)	423	228	80,6		s/i
Sistema de Omnibus de Transito Rápido y Carriles Exclusivos (BIRF N° 8700 / BIRF N°7794)	150	150	85,5		1,0
Subtotal 3 principales obras	1.763	2.603	85,5		n/c
Resto	2.978	441	100,0		n/c
Total	4.740	3.044	100,0		n/c
Provincia de Buenos Aires					
Autopista Camino del Buen Ayre	5.446	974	32,0		23,6
Autopista Ruta Nacional N° 7 Lujan - Junín	3.553	939	62,9		14,6
Autopista Ruta Nacional N° 8 Pilar - Pergamino	8.118	2.238	136,4		24,3
Subtotal 3 principales obras	17.117	4.151	136,4		n/c
Resto	10.174	1.858	197,4		n/c
Total	27.291	6.010	197,4		n/c
Provincia de Catamarca					
Construcción de Jardín N° 6 Anexo - San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca - PROMEDU IV (BID 3455/OC-AR)	25	12	0,4		53,0
Malla 408C - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0060 - Provincia de Catamarca	272	10	0,7		14,0
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias	47	27	1,6		100,0
Subtotal 3 principales obras	344	49	1,6		n/c
Resto	99	26	2,5		n/c
Total	443	75	2,5		n/c
Provincia de Córdoba					
Autopista Ruta Nacional N° 19 San Francisco - Córdoba (BID 3836 OC-AR)	2.153	1.453	47,7		31,8
Malla 230 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0158 - Provincia de Córdoba (FONPLATA ARG-44/2019)	287	100	51,0		12,0
Repavimentación Ruta Nacional N° 158 - Córdoba	512	353	62,6		44,9
Subtotal 3 principales obras	2.953	1.907	62,6		n/c
Resto	1.325	236	70,4		n/c
Total	4.278	2.143	70,4		n/c
Provincia de Corrientes					
Construcción de Puente sobre Arroyo Iribu Cua	40	23	0,8		12,8
Crema Malla 534 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0014 - Provincia de Corrientes (BID 3050)	387	304	10,8		16,8
Travesía Urbana Corrientes	412	218	17,9		83,3
Subtotal 3 principales obras	839	546	17,9		n/c
Resto	601	92	20,9		n/c
Total	1.440	637	20,9		n/c

Obras en proyectos de inversión	Ejecución financiera			Ejecución física (%)	
	Vigente	Devengado	% ac.	Prog. a junio	Ejec. a junio
Provincia del Chaco					
Autopista Ruta Nacional N° 16 Resistencia - Roque Sáenz Peña	555	276	9,1		21,9
Autovía Ruta Nacional N° 11	1.577	119	13,0		32,1
Crema Malla 536 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0089 - Provincia de Chaco (BID 3050)	185	170	18,5		7,2
Subtotal 3 principales obras	2.317	564	18,5		n/c
Resto	601	229	26,1		n/c
Total	2.918	794	26,1		n/c
Provincia del Chubut					
Malla 113 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	108	107	3,5		15,5
Malla 635 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0040 - Provincia de Chubut (FONPLATA ARG-44/2019)	275	90	6,5		8,6
Red de Mantenimiento 13° Distrito - Chubut - Malla B (M13B)	192	163	11,8		100,0
Subtotal 3 principales obras	575	359	11,8		n/c
Resto	950	210	18,7		n/c
Total	1.525	569	18,7		n/c
Provincia de Entre Ríos					
Construcción de Sistema de Agua Potable en la Localidad de Concordia - Entre Ríos (BID 3451 OC-AR)	406	195	6,4		53,9
Malla 506 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0127 - Provincia de Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	18	15	6,9		12,7
Repavimentación Corredor 4 (Rutas Nacionales N° 18, 19, 34) - Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos (FONPLATA ARG-44/2019)	132	103	10,3		13,5
Subtotal 3 principales obras	556	314	10,3		n/c
Resto	883	55	12,1		n/c
Total	1.439	369	12,1		n/c
Provincia de Formosa					
Autovía Ruta Nacional N° 11	680	26	0,9		17,9
Crema MALLA 540 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	269	221	8,1		9,3
Crema Malla 542 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0081 - Provincia de Formosa (BID 3050)	77	65	10,3		9,0
Subtotal 3 principales obras	1.027	312	10,3		n/c
Resto	129	41	11,6		n/c
Total	1.156	353	11,6		n/c

Obras en proyectos de inversión	Ejecución financiera			Ejecución física (%)	
	Vigente	Devengado	% ac.	Prog. a junio	Ejec. a junio
Provincia de Jujuy					
Construcción de Centros Regionales de Hemoterapia	37	37	1,2		22,8
Corredor Noroeste Argentino (NOA) Autopistas Varias	865	483	17,1		62,5
Red de Mantenimiento 6° Distrito - Jujuy - Malla A (M06A)	111	81	19,8		100,0
Subtotal 3 principales obras	1.013	601	19,8		n/c
Resto	181	42	21,1		n/c
Total	1.194	644	21,1		n/c
Provincia de La Pampa					
Malla 116B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa	52	31	1,0		3,3
Malla 117A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2019)	67	26	1,9		29,2
Malla 117B - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0035 / Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA)	84	45	3,3		15,5
Subtotal 3 principales obras	203	102	3,3		n/c
Resto	419	26	4,2		n/c
Total	622	127	4,2		n/c
Provincia de La Rioja					
Ensanche Ruta Nacional N° 75 La Rioja - Los Sauces	1.049	201	6,6		68,6
Malla 303 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0038 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	200	114	10,3		10,2
Malla 309 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0074 - Provincia de La Rioja (FONPLATA ARG-44/2019)	35	36	11,5		7,3
Subtotal 3 principales obras	1.285	351	11,5		n/c
Resto	134	33	12,6		n/c
Total	1.419	385	12,6		n/c
Provincia de Mendoza					
Ampliación de Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes - Cuenca El Paramillo - Mendoza (BID 3451 OC-AR)	412	286	9,4		70,0
Malla 312 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0143 / Nacional N° 0144 / Nacional N° 0146 - Provincia de	105	84	12,2		6,0
Sistema Cristo Redentor: Autopista Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Lujan de Cuyo (BID 4418 OC-AR)	1.119	894	41,5		68,5
Subtotal 3 principales obras	1.637	1.264	41,5		n/c
Resto	965	113	45,2		n/c
Total	2.602	1.377	45,2		n/c

Obras en proyectos de inversión	Ejecución financiera			Ejecución física (%)	
	Vigente	Devengado	% ac.	Prog. a junio	Ejec. a junio
Provincia de Misiones					
Autopista Ruta Nacional N° 12 y Autovía Ruta Nacional N° 105 - Provincia de Misiones	1.229	579	19,0		24,6
Pavimentación Ruta Nacional N° 14 San Vicente - Irigoyen	262	208	25,9		9,5
Red de Mantenimiento 15° Distrito - Misiones - Malla C (M15C)	89	48	27,4		100,0
Subtotal 3 principales obras	1.579	835	27,4		n/c
Resto	309	107	31,0		n/c
Total	1.888	943	31,0		n/c
Provincia del Neuquén					
Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito	267	298	9,8		13,1
Malla 109 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0237 / Nacional N° 0040 / Nacional N° 0231 - Provincia de	271	154	14,8		15,2
Ruta Segura Ruta Nacional N° 40 Circunvalación a Villa La Angostura	462	290	24,4		51,3
Subtotal 3 principales obras	1.000	742	24,4		n/c
Resto	910	306	34,4		n/c
Total	1.910	1.048	34,4		n/c
Provincia de Río Negro					
Autopista Ruta Nacional N° 22 Chichinales - Arroyito	667	404	13,3		13,7
Colector Costanero San Carlos de Bariloche (BID 2343 OC-AR)	128	128	17,5		50,3
Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)	364	135	21,9		16,0
Subtotal 3 principales obras	1.160	667	21,9		n/c
Resto	1.535	563	40,4		n/c
Total	2.695	1.230	40,4		n/c
Provincia de Salta					
Crema MALLA 439 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0081 - Provincia de Salta (BID 3050)	266	175	5,8		4,5
Obras de Seguridad en Distrito Salta	45	44	7,2		s/i
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	0	1.676	62,3		21,6
Subtotal 3 principales obras	311	1.896	62,3		n/c
Resto	720	111	65,9		n/c
Total	1.031	2.007	65,9		n/c
Provincia de San Juan					
Autopista Ruta Nacional N° 40 Mendoza - San Juan	582	168	5,5		24,4
Autopistas Acceso San Juan	1.932	1.333	49,3		23,3
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias	121	70	51,6		100,0
Subtotal 3 principales obras	2.635	1.571	51,6		n/c
Resto	125	69	53,9		n/c
Total	2.760	1.640	53,9		n/c

Obras en proyectos de inversión	Ejecución financiera			Ejecución física (%)	
	Vigente	Devengado	% ac.	Prog. a junio	Ejec. a junio
Provincia de San Luis					
Malla 129 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0188 - Provincia de La Pampa (FONPLATA ARG-44/2018)	82	41	1,3		8,2
Malla 307 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0020 - Provincia de San Luis (FONPLATA ARG-44/2019)	88	44	2,8		18,0
Repavimentación AU 7 - San Luis	112	58	4,7		s/i
Subtotal 3 principales obras	282	143	4,7		n/c
Resto	280	40	6,0		n/c
Total	562	183	6,0		n/c
Provincia de Santa Cruz					
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias	32	23	0,8		100,0
Red de Mantenimiento 23° Distrito - Santa Cruz - Malla A (M23A)	77	36	1,9		100,0
Ruta Nacional N° 3,40,281,288,293 - Tramo: TFO Santa Cruz - Convenio 14, Sección: Tramos Varios	246	21	2,6		44,2
Subtotal 3 principales obras	356	80	2,6		n/c
Resto	89	36	3,8		n/c
Total	445	115	3,8		n/c
Provincia de Santa Fe					
Autopista Ruta Nacional N° 34 Angélica - Sunchales	2.407	520	17,1		17,4
Renovación de Vías y Corredor del Ferrocarril General Belgrano Cargas (CDB S/N)	0	245	25,1		21,6
Repavimentación Corredor 5 (Rutas Nacionales N° 9, 11, A012, 193) - Santa Fe (FONPLATA ARG-44/2019)	643	345	36,5		24,7
Subtotal 3 principales obras	3.050	1.110	36,5		n/c
Resto	3.631	869	65,0		n/c
Total	6.681	1.978	65,0		n/c
Provincia de Santiago del Estero					
Crema Malla 431A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0034 - Provincia de Santiago del Estero (BID 3050)	282	191	6,3		7,7
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias	51	17	6,8		100,0
Repavimentación Ruta Nacional N° 16 - Santiago del Estero (BID 2698 OC-AR)	438	38	8,1		46,6
Subtotal 3 principales obras	771	246	8,1		n/c
Resto	191	31	9,1		n/c
Total	962	278	9,1		n/c
Provincia de Tucumán					
Crema MALLA 409A - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0157 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	916	498	16,4		21,2
Crema Malla 437 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N°0038 - Provincia de Tucumán (BID 3050)	73	44	17,8		10,9
Red de Mantenimiento 3° Distrito - Tucumán - Malla A (M03A)	36	20	18,5		100,0
Subtotal 3 principales obras	1.025	562	18,5		n/c
Resto	3.814	30	19,5		n/c
Total	4.839	592	19,5		n/c

Obras en proyectos de inversión	Ejecución financiera			Ejecución física (%)	
	Vigente	Devengado	% ac.	Prog. a junio	Ejec. a junio
Provincia de Tierra del Fuego					
Malla 603 - Obras de Recuperación y Mantenimiento en Ruta Nacional N° 0003 Tramo San Sebastián - Tolhuin, Provincia de Tierra del Fuego	214	109	3,6		8,5
Mantenimiento por Administración y Atención de Emergencias en Rutas Varias	37	33	4,7		100,0
Pavimentación Tramo Ruta Nacional N° 3	606	146	9,5		77,4
Subtotal 3 principales obras	857	288	9,5		n/c
Resto	88	13	9,9		n/c
Total	945	302	9,9		n/c
Interprovincial					
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 6	842	462	15,2		4,9
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 7	513	317	25,6		5,9
Obras de Mantenimiento y Servicios de Apoyo (OMSA) en el Corredor Vial 8	496	409	39,0		5,5
Subtotal 3 principales obras	1.851	1.188	39,0		n/c
Resto	11.810	874	67,7		n/c
Total	13.662	2.061	67,7		n/c
Nacional					
Rutas Varias - Tramo Obras y Compra de Materiales para Seguridad Vial	291	83	2,7		100,0
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdoba	102	80	5,4		35,2
Señalamiento Horizontal. Rutas Nacionales Zona Sur (Etapa IV A) Provincias de Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Rio Negro	310	245	13,4		46,0
Subtotal 3 principales obras	702	408	13,4		n/c
Resto	4.750	115	17,2		n/c
Total	5.452	523	17,2		n/c
No Clasificado					
Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas	3	0	0,0		0,4
Misiones Satelitales	73	18	0,6		s/i
Misiones Satelitales - Etapa III (CAF N° 8700)	239	34	1,7		16,0
Subtotal 3 principales obras	315	53	1,7		n/c
Resto	0	0	1,7		n/c
Total	315	53	1,7		n/c
Total - 785 obras	95.214	29.478		n.c.	n.c.

(s/i): sin información.

(n/c): no corresponde.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 17. Transferencias de capital por función

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Función	2019	2020			Var. % real a/a
	Devengado	Vigente	Devengado	% de ejecución	
Agua Potable y Alcantarillado	8.634	42.795	30.697	71,7	142
Vivienda y Urbanismo	15.218	39.353	6.298	16	-71,8
Salud	55	8.248	4.450	53,9	5.366,9
Ecología y Medio Ambiente	2.853	9.004	4.253	47,2	1,5
Energía, Combustibles y Minería	2.942	11.841	4.214	35,6	-2,5
Educación y Cultura	3.831	8.653	3.639	42,1	-35,3
Transporte	4.971	13.326	2.960	22,2	-59,5
Relaciones Interiores	2.172	5.597	2.787	49,8	-12,6
Promoción y Asistencia Social	981	4.442	407	9,2	-71,8
Sistema Penal	112	1.067	353	33,1	114,5
Ciencia y Técnica	359	924	329	35,6	-37,6
Agricultura	352	1.471	274	18,6	-47,1
Comunicaciones	601	879	107	12,2	-87,9
Industria	15	1.582	89	5,6	317,3
Comercio, Turismo y Otros Servicios	75	1.500	60	4	-45,7
Seguridad Interior	0	29	23	79,6	-
Trabajo	14	132	14	10,2	-36
Dirección Superior Ejecutiva	0	0	0	-	-
Administración Fiscal	0	396	0	-	-
Defensa	0	74	0	-	-
Total	43.186	151.312	60.953	40,3	-3,9

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 18. Transferencias de capital por ubicación geográfica

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Ubicación geográfica	2019	2020			Var. % real a/a	
	Devengado	Vigente	Devengado	% de ejecución		Gasto per cápita
CABA	14.653	29.112	17.363	59,6	5.645	-19,3
Buenos Aires	4.083	16.765	4.415	26,3	252	-26,4
La Rioja	2.322	5.546	2.878	51,9	7.312	-15,6
Santa Cruz	1.446	7.505	2.706	36,1	7.399	27,4
Córdoba	1.871	2.487	1.151	46,3	306	-58,1
Salta	1.850	3.752	955	25,4	670	-64,9
Tucumán	468	1.441	954	66,2	563	38,6
Entre Ríos	630	2.135	879	41,2	634	-5,0
Santa Fe	488	1.851	804	43,4	227	12,1
Misiones	878	2.497	774	31	614	-40,0
Chaco	1.004	2.217	750	33,8	622	-49,2
Mendoza	752	2.974	664	22,3	334	-39,9
Formosa	641	2.176	632	29	1.044	-32,9
La Pampa	111	568	553	97,4	1.541	239,5
Neuquén	849	2.266	478	21,1	719	-61,7
Río Negro	468	1.096	411	37,5	550	-40,1
Corrientes	704	1.248	397	31,8	355	-61,6
Santiago del Estero	812	2.011	324	16,1	331	-72,8
Jujuy	463	1.698	315	18,5	408	-53,7
Catamarca	720	1.177	225	19,1	541	-78,8
Tierra del Fuego	233	469	167	35,6	962	-51,1
San Juan	714	2.503	76	3	98	-92,7
Chubut	178	998	49	4,9	79	-81,2
San Luis	93	456	38	8,3	74	-72,5
Nacional	4.116	19.557	5.583	28,5	1.230	-7,7
Interprovincial	2.638	36.115	17.414	48,2	n.c.	349,3
Binacional	0	0	0	-	n.c.	-
No Clasificado	0	696	0	-	n.c.	-
Total	43.186	151.312	60.953	40,3	1.343	-3,9

(n/c): no corresponde.

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Cuadro 19. Transferencias de capital a Instituciones Provinciales y Municipales

Acumulado a junio. En millones de \$, % de ejecución y % de var real a/a

Provincia	Vigente	Devengado					% de ejec.	Var. % real a/a
		Gobiernos Prov.	EEPP Fin. Prov.	Inst. de Enseñanza Prov.	Gobiernos Mun.	TOTAL		
CABA	5.250	195	-	9	0	204	3,9	-84,7
Buenos Aires	5.824	648	-	50	450	1.148	19,7	-67,3
Catamarca	1.136	211	-	2	0	213	18,7	-79,4
Córdoba	1.736	994	-	18	35	1.047	60,3	-59,4
Corrientes	1.030	378	-	5	3	387	37,5	-59,8
Chaco	1.631	687	-	4	0	692	42,4	-50,3
Chubut	433	24	-	3	21	48	11,0	-81,4
Entre Ríos	1.005	817	-	6	52	876	87,1	-3,0
Formosa	572	394	-	3	0	397	69,3	-29,0
Jujuy	993	309	-	3	2	314	31,6	-53,1
La Pampa	228	518	-	2	32	552	242,1	251,5
La Rioja	4.357	2.729	-	2	147	2.877	66,0	-14,8
Mendoza	2.078	653	0	11	0	664	31,9	-39,1
Misiones	1.890	678	-	8	0	685	36,3	-45,2
Neuquén	1.757	471	-	5	0	475	27,1	-61,0
Río Negro	993	238	-	4	21	263	26,5	-57,4
Salta	2.941	939	5	6	0	951	32,3	-63,2
San Juan	2.254	67	-	7	0	75	3,3	-92,6
San Luis	445	20	-	2	15	37	8,4	-70,1
Santa Cruz	380	19	-	2	1	21	5,5	-87,4
Santa Fe	885	727	-	12	31	770	87,1	18,1
Santiago del Estero	1.905	314	-	5	4	323	17,0	-72,3
Tucumán	1.282	677	-	8	248	932	72,7	38,6
Tierra del Fuego	330	163	-	1	3	167	50,5	-49,0
Interprovincial	694	0	-	-	0	-	0	-
Nacional	8.510	0	-	0	0	-	0	-
No Clasificado	685	0	-	-	-	-	0	-
Total	51.223	12.869	5	180	1.065	14.118	27,6	-48,9

FUENTE: OPC en base a datos E.Sidif.

Publicaciones de la OPC

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación fue creada por la Ley 27.343 para brindar soporte al Poder Legislativo y profundizar la comprensión de temas que involucren recursos públicos, democratizando el conocimiento y la toma de decisiones. Es una oficina técnica de análisis fiscal que produce informes abiertos a la ciudadanía. Este informe no contiene recomendaciones vinculantes.

www.opc.gob.ar



Hipólito Yrigoyen 1628. Piso 10 (C1089aaf) CABA, Argentina.
T. 54 11 4381 0682 / contacto@opc.gob.ar

www.opc.gob.ar
